Mise en conformité NIS2 — HydroRégie

Réponse complète au cas pratique

Entité	HydroRégie — régie des eaux, 450 000 habitants desservis
Objet	Mise en conformité à la directive (UE) 2022/2555 (NIS2)
Statut de l'entité	Entité essentielle — art. 3(1)(a), annexe I point 6
Autorité compétente	France — ANSSI
Document	Réponse aux 4 blocs du cas pratique
Date	1er octobre 2026
Version	1.1
Classification	Diffusion restreinte

Avertissement méthodologique

Ce document distingue systématiquement trois natures d'information :

Marqueur	Signification
🟩 **Texte**	Provient directement de la directive (UE) 2022/2555 — l'article est cité
🟧 **Source**	Provient d'une source officielle (ANSSI, ENISA, Légifrance) — le lien est donné
🟥 **Hypothèse**	Hypothèse de travail construite pour ce cas d'école (chiffres, dates, scénario)

Point de vigilance sur le droit applicable (vérifié le 1er octobre 2026) : au niveau européen, NIS2 s'applique depuis le **18 octobre 2024** (art. 41) et abroge NIS1 à cette même date (art. 44). En France, **la loi de transposition n'est pas promulguée à ce jour** : le projet de loi « résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité » — dit **loi Résilience** — a été adopté par le Sénat les 11 et 12 mars 2025, voté en commission spéciale à l'Assemblée nationale en septembre 2025, et inscrit en **séance publique à partir du 7 octobre 2026** ; les décrets et arrêtés suivront la promulgation.

Deux faits sont intervenus entre-temps : l'**ANSSI** a publié le **ReCyF** (Référentiel Cyber France) le **17 mars 2026**, pour que les entités concernées n'attendent pas la loi ; et la **Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne contre la France** le **8 juillet 2026**, pour défaut de transposition dans le délai de l'article 41.

Conséquence : toutes les obligations citées dans ce document s'appuient sur **le texte de la directive** et sur le ReCyF. Une directive non transposée ne crée pas d'obligation directement opposable à une régie — il n'y a pas d'effet direct horizontal — mais **le contenu des obligations est fixé** ; seule la date à laquelle elles deviennent opposables reste à arrêter. Les points qui dépendront des textes nationaux (seuils précis de qualification d'un incident, modalités exactes d'enregistrement, calendrier d'application) sont signalés comme tels, et un jalon de revue réglementaire est inscrit à la feuille de route.

Sommaire

Partie	Livrable	Bloc du sujet
1	Note de qualification réglementaire	Bloc 1
2	Analyse d'écart et feuille de route de mise en conformité	Bloc 2
3	Architecture réseau segmentée IT / OT	Bloc 3
4	Chronologie de gestion de crise et notifications réglementaires	Bloc 4
A	Annexe — Alerte précoce (24 h)	Bloc 4
B	Annexe — Notification d'incident (72 h)	Bloc 4
C	Annexe — Rapport final (1 mois)	Bloc 4
D	Annexe — Information des usagers	Bloc 4
E	Annexe — Notification CNIL (RGPD)	Bloc 4

Le projet en une page

Le contexte. HydroRégie capte, traite, stocke et distribue l'eau potable à 450 000 habitants répartis sur 62 communes, pour 240 000 abonnés facturés. Son système d'information de gestion (IT) et son système industriel (OT) partagent aujourd'hui **le même réseau**, sans aucun cloisonnement. Un courrier de l'autorité nationale vient de confirmer son statut d'**entité essentielle**.

Le risque. Sur un réseau plat, une compromission bureautique — une pièce jointe piégée, un mot de passe volé — donne un accès direct aux automates qui commandent les pompes, les vannes et la chloration. L'enjeu n'est pas la fuite de données : c'est **la continuité et la qualité de l'eau potable**, donc la santé publique.

La réponse, en quatre temps.

1. **Qualifier** — HydroRégie relève de l'annexe I, point 6 (eau potable) et dépasse les seuils de la grande entreprise : elle est **entité essentielle** au titre de l'article 3(1)(a). La qualification est confirmée par trois voies indépendantes.
2. **Mesurer** — Sa maturité au regard des dix domaines de l'article 21 est de **0,6 sur 4**, avec **18 écarts** dont **6 critiques**. Un plan de 24 mois, chiffré à environ **956 k€**, porte cette maturité à **3,3 sur 4**.
3. **Concevoir** — Une architecture en **9 zones**, séparées par **deux pare-feu en cascade** et une **DMZ industrielle** qui constitue le seul point de rencontre entre l'IT et l'OT. Aucun flux direct entre la bureautique et l'industriel ; le seul protocole franchissant une frontière de zone est OPC UA, imposé en mode **SignAndEncrypt**.
4. **S'entraîner** — Un scénario de crise complet montre que les délais de **24 heures**, **72 heures** et **un mois** sont tenables, et surtout que **l'eau continue de couler** pendant six jours d'exploitation en mode dégradé autonome.

La conviction du projet. La segmentation IT/OT n'est pas une exigence de conformité : c'est la mesure qui permet de continuer à distribuer de l'eau pendant qu'on traite l'incident. Tout le reste en découle.

PARTIE 1

Bloc 1 — Note de qualification réglementaire

> **Objet** : qualifier HydroRégie au regard de la directive (UE) 2022/2555 (NIS2) et en déduire les obligations applicables. **Destinataire** : Direction générale d'HydroRégie **Rédacteur** : équipe projet mise en conformité NIS2 **Date** : 10 septembre 2026 **Version** : 1.0 **Classification** : Diffusion restreinte

1. Synthèse pour la direction

> 🔴 **HydroRégie est une ENTITÉ ESSENTIELLE au sens de l'article 3(1)(a) de la directive (UE) 2022/2555.**

Élément	Conclusion
Secteur	Eau potable — **annexe I, point 6** de la directive
Taille	**Grande entreprise** (380 salariés ≥ 250 ; 72 M€ de CA et 95 M€ de bilan)
Statut	🔴 **Entité essentielle** — art. 3(1)(a)
Autorité compétente	France — ANSSI (art. 26(1))
Obligations principales	Gouvernance (art. 20), mesures de gestion des risques (art. 21), notification des incidents (art. 23), enregistrement (art. 3(4))
Supervision	*Ex ante* et *ex post* (art. 32) : audits, inspections et scans **sans incident préalable**
Sanction maximale encourue	**10 000 000 €** ou **2 %** du CA mondial annuel, le montant le plus élevé (art. 34(4)) ; interdiction temporaire d'exercer pour un dirigeant (art. 32(5)(b))

La qualification est confirmée par trois voies indépendantes (secteur + effectif, secteur + critères financiers, et impact santé publique au titre de l'art. 2(2)). Elle n'est pas discutable.

2. Méthode de qualification

La qualification suit le raisonnement en quatre questions imposé par le texte :

```
Q1  Mon secteur figure-t-il aux annexes I ou II ?          -> art. 2(1)
Q2  Quelle est ma taille (recommandation 2003/361/CE) ?    -> art. 2(1)
Q3  Le croisement secteur x taille donne quel statut ?     -> art. 3(1) et 3(2)
Q4  Un cas particulier modifie-t-il la conclusion ?        -> art. 2(2), art. 3(1)(b)-(g)
```

3. Q1 — Le secteur d'activité

3.1 L'activité d'HydroRégie

HydroRégie assure le **captage, la production, le stockage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine** pour 62 communes et 450 000 habitants, avec 240 000 abonnés facturés.

3.2 Le rattachement à l'annexe I

📗 L'**annexe I de la directive** liste 11 secteurs dits « hautement critiques ». Le **point 6 — Eau potable** vise :

> les **fournisseurs et distributeurs d'eau destinée à la consommation humaine** au sens de l'article 2, point 1 a), de la directive (UE) 2020/2184, **à l'exclusion** des distributeurs pour lesquels la distribution d'eau destinée à la consommation humaine constitue une **partie non essentielle** de leur activité générale de distribution d'autres produits et biens.

3.3 Vérification de l'exclusion

Critère	Analyse	Résultat
L'eau distribuée est-elle destinée à la consommation humaine ?	Oui, au sens de la directive (UE) 2020/2184	✅ Dans le champ
La distribution d'eau est-elle une activité **accessoire** ?	**Non** : c'est l'activité **unique et principale** de la régie	✅ **Exclusion non applicable**

📕 *Hypothèse retenue : HydroRégie exploite exclusivement l'eau potable ; l'assainissement relève d'un syndicat distinct. Si HydroRégie exploitait également les eaux usées, elle relèverait en outre du point 7 de l'annexe I, sans changement de statut mais avec un périmètre déclaré élargi.*

3.4 Indifférence de la forme juridique

📗 L'article 6, point 38, définit l'« entité » comme **toute personne physique ou morale créée et reconnue comme telle en vertu du droit national**. La qualité de régie publique, d'EPIC ou de société publique locale est donc **sans incidence** : l'annexe I vise l'**activité**, pas le statut.

> ✅ **Conclusion Q1** : HydroRégie relève de l'**annexe I, point 6**.

---

4. Q2 — La taille de l'entité

📗 L'article 2(1) renvoie à l'article 2 de l'annexe à la **recommandation 2003/361/CE**.

4.1 Les seuils

Catégorie	Effectif	Critères financiers
Moyenne entreprise	< 250	CA ≤ 50 M€ **ou** bilan ≤ 43 M€
Grande entreprise (dépasse les plafonds)	**≥ 250**	**ou** CA > 50 M€ **et** bilan > 43 M€

4.2 Application à HydroRégie 📕

Donnée	Valeur HydroRégie	Seuil « grande entreprise »	Résultat
Effectif	**380 salariés**	≥ 250	✅ **Dépassé**
Chiffre d'affaires annuel	**72 M€**	> 50 M€	✅ Dépassé
Total de bilan	**95 M€**	> 43 M€	✅ Dépassé

> 🔑 **Le critère d'effectif suffit à lui seul** : 380 ≥ 250. Les critères financiers, tous deux dépassés, confirment la qualification par une **seconde voie indépendante**.

4.3 Vérification de la consolidation

📗 La recommandation 2003/361/CE impose de consolider les données des **entreprises liées et partenaires**. 📕 *Hypothèse : HydroRégie ne détient aucune filiale et n'est détenue par aucune entreprise au sens de la*

recommandation (elle est rattachée à un établissement public de coopération intercommunale, qui n'est pas une « entreprise » au sens du texte). La consolidation ne modifie donc pas le calcul. **À faire vérifier par le service juridique** avant l'enregistrement officiel.

> ✅ **Conclusion Q2** : HydroRégie est une **grande entreprise** au sens de NIS2.

---

5. Q3 — Le croisement secteur × taille

	Annexe I	Annexe II
Grande entreprise	🔴 **Entité essentielle** — art. 3(1)(a)	Entité importante
Moyenne entreprise	Entité importante	Entité importante

```
Annexe I, point 6 (eau potable)  +  grande entreprise (380 salaries)
                        |
                        v
              Article 3(1)(a)
                        |
                        v
           >> ENTITE ESSENTIELLE <<
```

> ✅ **Conclusion Q3** : HydroRégie est une **entité essentielle** au titre de l'article 3(1)(a).

---

6. Q4 — Vérification des cas particuliers

6.1 Les cas de l'article 2(2) — entités concernées quelle que soit leur taille

Cas	Applicable à HydroRégie ?	Analyse
2(2)(a) — communications électroniques	❌ Non	—
2(2)(b) — services de confiance	❌ Non	—
2(2)(c) — DNS / TLD	❌ Non	—
2(2)(d) — **seul prestataire** dans l'État d'un service essentiel	🟡 Partiellement	HydroRégie est **le seul** distributeur d'eau potable sur son territoire, sans alternative pour les usagers
2(2)(e) — **impact important sur la santé publique**	✅ **Oui**	Une altération de la qualité ou une rupture de distribution affecte directement la santé de 450 000 personnes
2(2)(f) — risque systémique	🟡 Partiellement	Interconnexions avec les réseaux voisins
2(2)(g) — importance particulière au niveau régional	✅ **Oui**	Service vital à l'échelle de l'agglomération
2(2)(h) — administration publique	❌ Non applicable en tant que tel	La régie exerce une activité industrielle et commerciale

> 🔑 **Conséquence** : même si HydroRégie n'atteignait **pas** les seuils de taille, elle serait dans le champ de la directive par l'article 2(2), points (e) et (g). La qualification est donc **robuste face à une évolution de ses effectifs ou de son chiffre d'affaires**.

6.2 Les autres voies vers le statut essentiel (art. 3(1)(b) à (g))

Voie	Applicable ?
3(1)(b) — services de confiance qualifiés, TLD, DNS	❌ Non
3(1)(c) — communications électroniques, moyenne entreprise	❌ Non
3(1)(d) et (e) — administration publique	❌ Non
3(1)(f) — **entité critique au titre de la directive (UE) 2022/2557 (REC)**	🟡 **À vérifier** — si HydroRégie est identifiée comme entité critique au titre de la directive REC, elle serait **en outre** essentielle par cette voie, avec des obligations de résilience **physique** supplémentaires
3(1)(g) — ancien opérateur de services essentiels (NIS1)	🟡 **À vérifier** auprès de l'autorité

> ⚠️ **Point de vigilance à porter à la direction** : la directive REC (UE) 2022/2557 est transposée par **le même projet de loi français** que NIS2. Si HydroRégie est désignée entité critique, elle devra également conduire une **évaluation des risques** et un **plan de résilience** couvrant les risques physiques (intrusion, sabotage, catastrophe naturelle). **À clarifier dès la promulgation.**

6.3 Le courrier de l'autorité nationale

Le courrier reçu **confirme** le statut d'entité essentielle. Il est important de comprendre sa portée juridique exacte :

Ce que le courrier fait	Ce que le courrier ne fait pas
Il **confirme** une qualification qui résulte de la loi	Il ne **crée** pas l'obligation
Il identifie HydroRégie auprès de l'autorité	Il ne dispense pas de l'enregistrement (art. 3(4))
Il fixe l'interlocuteur	Il ne fixe pas de délai de mise en conformité propre

> 📗 L'obligation naît du **texte**, pas du courrier. Une entité qui n'aurait reçu aucun courrier resterait pleinement soumise à la directive : le système NIS2 repose sur l'**auto-qualification**.

> ✅ **Conclusion Q4** : la qualification d'entité essentielle est **confirmée et renforcée**.

---

7. Les obligations qui découlent du statut

7.1 Vue d'ensemble

#	Obligation	Article	Échéance
1	**Enregistrement** auprès de l'autorité nationale (nom, adresse, coordonnées, secteur, plages IP)	3(4)	Dès l'ouverture de l'enregistrement obligatoire ; **pré-enregistrement possible dès maintenant** sur MonEspaceNIS2
2	Mise à jour des informations en cas de changement	3(4)	**Sous 2 semaines**
3	**Gouvernance** : approbation par la direction, supervision, formation des dirigeants	20	Immédiat
4	**Mesures de gestion des risques** couvrant les 10 domaines	21(2)	Immédiat, avec plan de progression
5	Prise en compte des **fournisseurs directs**	21(3)	Immédiat
6	**Correction sans délai** des non-conformités constatées	21(4)	Permanent
7	**Notification des incidents importants** : 24 h / 72 h / 1 mois	23(4)	Permanent — **procédure à écrire en priorité**
8	**Information des destinataires** des services affectés	23(1)	Permanent
9	Information en cas de **cybermenace importante**	23(2)	Permanent

7.2 Ce que le statut « essentiel » ajoute par rapport à « important »

	Entité essentielle (HydroRégie)	Entité importante
Supervision	**Ex ante et ex post** — audits, inspections sur site, scans **sans incident** (art. 32(2))	Ex post uniquement (art. 33)
Coût des audits ciblés	**À la charge de l'entité** (art. 32(7))	—
Amende maximale	**10 M€ ou 2 %** du CA mondial, le plus élevé (art. 34(4))	7 M€ ou 1,4 % (art. 34(5))
Suspension d'agrément	**Possible** (art. 32(5)(a))	Non prévue
Interdiction temporaire d'exercer pour un dirigeant	**Possible** (art. 32(5)(b))	Non prévue

> 💡 **Message à la direction** : les mesures à mettre en œuvre sont les mêmes qu'une entité importante. Ce qui change, c'est que **le contrôle peut arriver sans prévenir et sans incident**, et que la responsabilité personnelle du directeur général est engagée.

---

8. L'articulation avec les autres réglementations

Texte	Applicable à HydroRégie ?	Articulation
RGPD — règlement (UE) 2016/679	✅ Oui — 240 000 abonnés	**Cumul** des obligations de notification (CNIL 72 h **et** ANSSI 24 h/72 h/1 mois). Pas de cumul des **amendes** pour le même comportement (art. 35 NIS2)
Directive REC — (UE) 2022/2557	🟡 À vérifier	Si désignée entité critique : obligations de résilience physique **en plus**, et statut essentiel confirmé par l'art. 3(1)(f)
Directive (UE) 2020/2184 — eau destinée à la consommation humaine	✅ Oui	Qualité de l'eau et évaluation des risques du système de distribution. **Complémentaire**, pas substituable
DORA — règlement (UE) 2022/2554	❌ Non	Secteur financier uniquement
Art. 4 NIS2 (*lex specialis*)	❌ Sans effet ici	Aucun acte sectoriel de l'Union n'impose au secteur de l'eau des obligations équivalentes

9. Périmètre du système d'information concerné

📗 L'article 6, point 1, définit le « réseau et système d'information » de façon suffisamment large pour couvrir **l'ensemble** des équipements traitant des données numériques.

Domaine	Composants	Dans le périmètre NIS2 ?
IT bureautique	420 postes, AD, messagerie M365, serveurs de fichiers	✅ Oui
IT métier	ERP de facturation, portail abonnés, GMAO, SIG	✅ Oui
OT supervision	Superviseur SCADA redondé, historian	✅ Oui
OT contrôle	~350 automates et RTU, IHM locales	✅ **Oui**
Télérelève	60 000 compteurs communicants et leur concentrateur	✅ Oui
Réseau	Commutateurs, liaisons fibre, APN 4G privé, VPN	✅ Oui
Équipements purement mécaniques sans électronique	Vannes manuelles	❌ Non

> 🔴 **Conclusion structurante** : l'OT est **pleinement dans le périmètre**. Il n'existe aucune possibilité d'exclure le système industriel de la conformité. Comme l'IT et l'OT ne sont aujourd'hui **pas cloisonnés**, l'ensemble constitue un **périmètre unique et indivisible** — ce qui rend la segmentation (bloc 3) indispensable, y compris pour **réduire le périmètre à protéger**.

10. Conclusion et recommandations immédiates

10.1 Conclusion

HydroRégie est une **entité essentielle** au sens de l'article 3(1)(a) de la directive (UE) 2022/2555, en tant qu'entité relevant de l'annexe I point 6 (eau potable) dépassant les seuils de la moyenne entreprise. Cette qualification est confirmée par le courrier de l'autorité nationale et renforcée par l'article 2(2), points (e) et (g).

10.2 Les 5 actions à engager immédiatement

#	Action	Responsable	Échéance
1	Créer le compte **MonEspaceNIS2** et procéder au pré-enregistrement	DSI	15 jours
2	Désigner un **référent NIS2** et un suppléant, avec lettre de mission signée du DG	Direction générale	15 jours
3	Créer le **comité de sécurité des SI (COSSI)** par délibération — art. 20(1)	Direction générale	1 mois
4	Écrire la **procédure de notification 24 h / 72 h / 1 mois** — art. 23	RSSI	**1 mois** (priorité absolue : un incident peut survenir avant la fin du plan)
5	Vérifier auprès de l'autorité si HydroRégie est visée par la **directive REC**	Juridique	2 mois

10.3 Réserve de rédaction

📕 À la date de cette note (**1er octobre 2026**), **la loi française de transposition n'est pas promulguée**. Le projet de loi « résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité » — dit **loi Résilience** — a été adopté par le Sénat les 11-12 mars 2025, voté en commission spéciale à l'Assemblée nationale en septembre 2025, et inscrit en **séance publique à partir du 7 octobre 2026** ; les décrets suivront.

Deux faits sont intervenus entre-temps :

- l'**ANSSI** a publié le **ReCyF** (Référentiel Cyber France) le **17 mars 2026**, précisément pour que les entités concernées n'attendent pas la loi ;
- la **Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne contre la France** le **8 juillet 2026**, pour défaut de transposition dans le délai de l'article 41.

Conséquence : la présente note s'appuie sur le **texte de la directive** et sur le **ReCyF**. Une directive non transposée ne crée pas d'obligation directement opposable à une régie — il n'y a pas d'effet direct horizontal. Mais **le contenu des obligations est fixé** ; seule la date à laquelle elles deviennent opposables reste à arrêter. Les seuils précis de qualification d'un incident significatif, les modalités exactes d'enregistrement et le calendrier d'application en France seront fixés par les textes nationaux. Une **revue de conformité est inscrite au plan d'actions**, déclenchée par leur publication.

Cela ne justifie **aucun report** : les mesures techniques et organisationnelles nécessaires demandent 18 à 24 mois de mise en œuvre.

📚 Fondements cités

Référence	Objet
Directive (UE) 2022/2555, **art. 2(1)**	Règle générale du champ d'application
Directive (UE) 2022/2555, **art. 2(2)** points (d), (e), (g)	Entités concernées quelle que soit leur taille
Directive (UE) 2022/2555, **art. 3(1)(a)**	Entité essentielle — annexe I + grande entreprise
Directive (UE) 2022/2555, **art. 3(4)**	Obligation d'enregistrement et de mise à jour
Directive (UE) 2022/2555, **art. 6** point 1 et point 38	Définitions de « réseau et système d'information » et d'« entité »
Directive (UE) 2022/2555, **annexe I, point 6**	Secteur de l'eau potable
Directive (UE) 2022/2555, **art. 20, 21, 23**	Obligations de fond
Directive (UE) 2022/2555, **art. 26(1)**	Compétence territoriale
Directive (UE) 2022/2555, **art. 32, 33, 34**	Supervision et sanctions
Recommandation **2003/361/CE**, annexe art. 2	Définition des catégories d'entreprises
Directive **(UE) 2020/2184**	Eau destinée à la consommation humaine
Directive **(UE) 2022/2557** (REC)	Résilience des entités critiques
ANSSI — Directive NIS 2	Seuils, secteurs, sanctions
FAQ MonEspaceNIS2 — transposition	État de la transposition française

PARTIE 2

Bloc 2 — Analyse d'écart et feuille de route de mise en conformité

> **Objet** : mesurer l'écart entre la situation actuelle d'HydroRégie et les exigences de l'article 21 de la directive (UE) 2022/2555, puis bâtir un plan d'actions daté et responsabilisé. **Date** : 10 septembre 2026 · **Version** : 1.0 · **T0 du plan** : 1er octobre 2026 **Classification** : Diffusion restreinte

---

1. Synthèse pour la direction

Indicateur	Valeur
Domaines de l'article 21(2) évalués	**10 / 10**
Maturité moyenne actuelle	**0,6 / 4**
Maturité cible à 24 mois	**3,3 / 4**
Écarts identifiés	**18**
Écarts critiques (à traiter sous 3 mois)	**6**
Durée du plan	**24 mois** (octobre 2026 → septembre 2028)
Budget total estimé 📕	**≈ 956 k€** dont **≈ 520 k€ d'investissement** et **≈ 436 k€ de fonctionnement sur 2 ans**
Amende maximale encourue en cas de manquement	**10 000 000 €** (art. 34(4))

> 🎯 **Le message en une phrase** : la mise en conformité coûte **moins d'un dixième** de l'amende maximale encourue, et **environ un tiers** du coût estimé d'un seul incident majeur (1,5 à 4 M€ 📕).

Le risque majeur, en une image

```
Aujourd'hui : reseau PLAT
  [Poste bureautique] --- rien ne bloque ---> [Automate de pompe]
  Une piece jointe piegee peut arreter la distribution d'eau de 450 000 habitants.

Cible : reseau SEGMENTE
  [Poste bureautique] --X-- [pare-feu] --X-- [DMZ] --X-- [pare-feu] --X-- [Automate]
  L'incident reste dans l'IT ; l'eau continue de couler.
```

---

2. Méthode d'évaluation

2.1 Référentiel

L'évaluation porte sur les **10 domaines de l'article 21(2)** de la directive, complétés par l'**article 20** (gouvernance) et l'**article 23** (notification). Les mesures techniques sont appréciées au regard du **guide ANSSI sur la cybersécurité des systèmes industriels** et de la norme **IEC 62443**, conformément à ce que permet l'article 25.

2.2 Échelle de maturité

Niveau	Nom	Critère
0	Inexistant	Le sujet n'est pas identifié, rien n'est fait
1	Initialisé	Des actions existent, informelles, dépendantes des personnes
2	Reproductible	La pratique est écrite, mais pas systématiquement appliquée
3	Défini	Procédure formalisée, appliquée, connue, avec des preuves
4	Maîtrisé	Mesurée par des indicateurs, contrôlée, améliorée

🎯 **Cible retenue** : **niveau 3 minimum** sur tous les domaines, **niveau 4** sur les quatre domaines critiques pour une entité essentielle du secteur de l'eau : gestion des incidents (b), continuité (c), contrôle d'accès (i), MFA et communications d'urgence (j).

2.3 Sources de l'évaluation 📕

Entretiens avec la DSI, l'exploitation et les deux intégrateurs ; revue documentaire ; inventaire technique partiel ; capture réseau passive de 15 jours ; revue des comptes Active Directory ; revue des contrats fournisseurs.

---

3. La cotation, domaine par domaine

#	Art.	Domaine	Actuel	Cible	Écart	Criticité
1	21(2)(a)	Analyse des risques et sécurité des SI	**0**	3	3	🟠 Élevée
2	21(2)(b)	Gestion des incidents	**1**	4	3	🔴 **Critique**
3	21(2)(c)	Continuité, sauvegardes, gestion de crise	**1**	4	3	🔴 **Critique**
4	21(2)(d)	Sécurité de la chaîne d'approvisionnement	**0**	3	3	🟠 Élevée
5	21(2)(e)	Acquisition, maintenance, vulnérabilités	**1**	3	2	🟠 Élevée
6	21(2)(f)	Évaluation de l'efficacité des mesures	**0**	3	3	🟡 Moyenne
7	21(2)(g)	Cyberhygiène et formation	**1**	3	2	🟠 Élevée
8	21(2)(h)	Cryptographie et chiffrement	**1**	3	2	🟡 Moyenne
9	21(2)(i)	RH, contrôle d'accès, gestion des actifs	**1**	4	3	🔴 **Critique**
10	21(2)(j)	MFA et communications sécurisées	**0**	4	4	🔴 **Critique**
—	art. 20	Gouvernance	**0**	4	4	🔴 **Critique**
—	art. 23	Notification des incidents	**0**	4	4	🔴 **Critique**

Maturité moyenne actuelle : 0,6 / 4.

Représentation

```
Art. 21(2)  Niveau actuel (#) / cible (o)
(a) risques      # . . o .      0 -> 3
(b) incidents    . # . . o      1 -> 4
(c) continuite   . # . . o      1 -> 4
(d) fournisseurs # . . o .      0 -> 3
(e) vulnerab.    . # . o .      1 -> 3
(f) efficacite   # . . o .      0 -> 3
(g) hygiene      . # . o .      1 -> 3
(h) crypto       . # . o .      1 -> 3
(i) acces        . # . . o      1 -> 4
(j) MFA / comm.  # . . . o      0 -> 4
art. 20 gouv.    # . . . o      0 -> 4
art. 23 notif.   # . . . o      0 -> 4
                 0 1 2 3 4
```

---

4. Le détail des 18 écarts

> Format : constat factuel → risque concret → action → article couvert.

🔴 Écarts critiques (traitement sous 3 mois)

ECART-01 — Aucun cloisonnement entre l'IT et l'OT

- **Article** : 21(2)(a), (b), (c), (i)
- **Constat** : un plan d'adressage unique (10.0.0.0/8), aucun VLAN ni pare-feu entre la bureautique et les automates. Un poste bureautique peut ouvrir une session Modbus/TCP (port 502) vers n'importe quel automate.
- **Risque** : une compromission bureautique (hameçonnage) donne un accès direct au pilotage des pompes, des vannes et de la chloration. **Impact potentiel : santé publique.**
- **Action** : projet de segmentation complet — voir bloc 3.
- **Maturité** : 0 → 3 · **Effort** : élevé · **Délai** : 18 mois (jalons intermédiaires dès 3 mois)

ECART-02 — Aucune procédure de notification des incidents

- **Article** : **23**
- **Constat** : aucune procédure écrite, aucun modèle de notification, aucun critère de qualification d'un incident important, aucun circuit de validation.
- **Risque** : dépassement des délais **24 h / 72 h / 1 mois** dès le premier incident. **Manquement direct** à l'article 23, sanctionnable au titre de l'article 34(4).
- **Action** : rédiger la procédure, les 3 modèles de notification, la grille de qualification et la liste de contacts ; les diffuser **sur papier**.
- **Maturité** : 0 → 3 · **Effort** : **faible** · **Délai** : **1 mois** 🔥
- 💡 *Écart le plus rentable du plan : quelques jours de travail, un risque de sanction supprimé.*

ECART-03 — Accès distant des intégrateurs non maîtrisé

- **Article** : 21(2)(d), (i), (j)

- **Constat** : deux intégrateurs disposent d'un accès **TeamViewer permanent** sur le poste d'ingénierie automates, via un **compte partagé**, sans MFA, sans traçabilité, avec un mot de passe transmis par courriel il y a trois ans.
- **Risque** : **le vecteur d'attaque documenté** contre les opérateurs d'eau. Aucune capacité à savoir qui s'est connecté ni ce qui a été modifié.
- **Action** : suppression de TeamViewer ; VPN nominatif + MFA + bastion avec enregistrement de session ; comptes **désactivés par défaut**, activés sur ticket pour une fenêtre limitée.
- **Maturité** : 0 → 4 · **Effort** : moyen · **Délai** : **3 mois**

ECART-04 — Sauvegardes vulnérables à un rançongiciel

- **Article** : 21(2)(c)
- **Constat** : sauvegardes sur un **NAS unique**, sur le même réseau, accessible avec les identifiants du domaine. Aucune copie hors ligne. Aucun test de restauration documenté depuis plus de 24 mois. **Les programmes automates ne sont pas sauvegardés** (ils résident sur le disque du poste d'ingénierie).
- **Risque** : un rançongiciel chiffre les données **et** les sauvegardes. La perte des programmes automates rendrait la reconstruction d'un site impossible en moins de plusieurs semaines.
- **Action** : règle **3-2-1-1-0** ; copie hors ligne (bande sortie du robot) ou stockage immuable ; compte de sauvegarde hors du domaine ; **versionnement des programmes automates** ; tests de restauration trimestriels documentés.
- **Maturité** : 1 → 4 · **Effort** : moyen · **Délai** : **3 mois**

ECART-05 — Aucune authentification multifacteur

- **Article** : 21(2)(j)
- **Constat** : pas de MFA sur la messagerie Microsoft 365, ni sur le VPN, ni sur les comptes d'administration.
- **Risque** : un seul mot de passe volé (hameçonnage, fuite externe, réutilisation) suffit à entrer.
- **Action** : MFA obligatoire par ordre de priorité — comptes d'administration, accès distants, messagerie, puis ensemble des utilisateurs.
- **Maturité** : 0 → 4 · **Effort** : **faible** · **Délai** : **3 mois** 🔥

ECART-06 — Aucune gouvernance de la sécurité

- **Article** : **20**
- **Constat** : aucune instance dédiée, aucune PSSI, aucun RSSI identifié, aucun dirigeant formé, aucun budget sécurité isolé.
- **Risque** : manquement direct à l'article 20 ; **responsabilité personnelle** des dirigeants (art. 20(1)) et interdiction temporaire d'exercer possible (art. 32(5)(b)).
- **Action** : créer le **COSSI** par délibération ; recruter ou désigner un **RSSI** avec lettre de mission ; former les membres de la direction ; approuver formellement PSSI et feuille de route.
- **Maturité** : 0 → 4 · **Effort** : faible à moyen · **Délai** : **3 mois**

🟠 Écarts élevés (traitement sous 9 mois)

ECART-07 — Aucune analyse de risques formalisée

- **Article** : 21(2)(a) · **Maturité** : 0 → 3 · **Délai** : 6 mois

- **Constat** : aucune analyse de risques, aucune PSSI, aucune cartographie des scénarios redoutés.
- **Risque** : impossible de justifier la **proportionnalité** des mesures devant un contrôle.
- **Action** : analyse **EBIOS Risk Manager** couvrant IT **et** OT, avec 5 scénarios stratégiques (rançongiciel, sabotage de la chloration, compromission par un fournisseur, indisponibilité de la télégestion, vol de données abonnés) ; PSSI dérivée et approuvée par le COSSI.

ECART-08 — Inventaire des actifs incomplet

- **Article** : 21(2)(i) · **Maturité** : 1 → 3 · **Délai** : 6 mois
- **Constat** : l'inventaire IT est partiel et l'inventaire OT **inexistant** — le nombre d'automates est estimé « environ 350 », sans liste ni versions de firmware.
- **Risque** : impossible de répondre à un avis de sécurité (« combien d'équipements concernés ? »), impossible de segmenter correctement, impossible de savoir ce qu'on protège.
- **Action** : inventaire exhaustif IT et OT (marque, modèle, version, localisation, criticité, responsable, fournisseur) ; découverte **passive** côté OT ; mise à jour continue via la GMAO.

ECART-09 — Comptes et droits non maîtrisés

- **Article** : 21(2)(i) · **Maturité** : 1 → 4 · **Délai** : 6 mois
- **Constat** : 68 comptes actifs sans connexion depuis plus de 12 mois 📕 ; comptes génériques partagés (`admin` , `technicien` , `scada`) ; aucune revue périodique des droits ; pas de procédure formalisée de départ.
- **Risque** : maintien d'accès après un départ ; impossibilité d'imputer une action.
- **Action** : revue complète, suppression des comptes génériques, nominativité, moindre privilège, comptes d'administration séparés des comptes bureautiques, **revue semestrielle** documentée.

ECART-10 — Aucune veille sur les vulnérabilités

- **Article** : 21(2)(e) · **Maturité** : 1 → 3 · **Délai** : 9 mois
- **Constat** : aucune veille CVE, aucun abonnement aux avis du CERT-FR, aucune politique de correctifs pour l'OT.
- **Risque** : exploitation de vulnérabilités connues et publiées, sur des équipements en service depuis 15 ans.
- **Action** : abonnement aux avis CERT-FR et éditeurs ; processus mensuel d'analyse ; politique de correctifs **différenciée IT / OT** ; pour l'OT non corrigeable, **mesures compensatoires documentées** (isolement, filtrage, surveillance renforcée) — approche explicitement admise par la proportionnalité de l'art. 21(1).

ECART-11 — Aucune exigence de sécurité vis-à-vis des fournisseurs

- **Article** : 21(2)(d), 21(3) · **Maturité** : 0 → 3 · **Délai** : 9 mois
- **Constat** : aucun contrat ne comporte de clause de sécurité, de délai de notification d'incident, ni de droit d'audit. Aucune évaluation des pratiques des intégrateurs.
- **Risque** : compromission par la chaîne d'approvisionnement, sans recours contractuel.
- **Action** : **annexe sécurité type** à insérer dans tous les contrats (notification d'incident sous 24 h, MFA, comptes nominatifs, droit d'audit, réversibilité, développement sécurisé) ; questionnaire d'évaluation des fournisseurs critiques ; clause de conformité NIS2 pour les fournisseurs eux-mêmes soumis à la directive.

ECART-12 — Sensibilisation quasi inexistante

- **Article** : 21(2)(g), 20(2) · **Maturité** : 1 → 3 · **Délai** : 6 mois

- **Constat** : une sensibilisation à l'arrivée, jamais renouvelée ; aucun exercice d'hameçonnage ; **aucun dirigeant formé** — ce qui est un manquement direct à l'article 20(2).
- **Action** : plan annuel de sensibilisation pour tous les agents ; module spécifique pour l'exploitation (risques OT, clés USB, accès prestataires) ; **formation obligatoire des membres du COSSI et de la direction** ; deux campagnes d'hameçonnage simulé par an.

🟡 Écarts moyens (traitement sous 18 mois)

ECART-13 — Aucune journalisation centralisée

- **Article** : 21(2)(b), (f) · **Maturité** : 0 → 3 · **Délai** : 12 mois
- **Constat** : journaux locaux, rétention de 7 jours sur les pare-feu, aucune corrélation, aucune alerte. Les horloges ne sont pas synchronisées sur l'ensemble du parc.
- **Risque** : incapacité à détecter, à qualifier et à **reconstituer** un incident — donc à écrire le rapport final de l'article 23(4)(d).
- **Action** : collecteur centralisé en zone d'administration isolée, rétention 12 mois, **NTP généralisé**, règles d'alerte, astreinte.

ECART-14 — Aucune détection sur le réseau industriel

- **Article** : 21(2)(b) · **Maturité** : 0 → 3 · **Délai** : 15 mois
- **Constat** : aucune visibilité sur ce qui circule dans le réseau OT.
- **Action** : sonde **passive** sur port miroir ; règles prioritaires : nouvel équipement, écriture Modbus hors SCADA, protocole inhabituel, trafic sortant depuis l'OT.

ECART-15 — Aucun plan de continuité formalisé

- **Article** : 21(2)(c) · **Maturité** : 1 → 4 · **Délai** : 12 mois
- **Constat** : les modes dégradés existent dans la pratique des exploitants, mais ne sont ni écrits, ni testés, ni connus des nouveaux arrivants.
- **Action** : formaliser les trois modes (nominal, dégradé autonome, manuel) ; définir RTO et RPO par système ; **tester la bascule en mode dégradé une fois par an** ; exercice de crise annuel.

ECART-16 — Chiffrement absent

- **Article** : 21(2)(h) · **Maturité** : 1 → 3 · **Délai** : 12 mois
- **Constat** : sauvegardes non chiffrées, postes portables non chiffrés, flux d'administration en clair (Telnet encore actif sur d'anciens commutateurs 🟥).
- **Action** : politique de cryptographie ; chiffrement des sauvegardes et des postes nomades ; suppression de Telnet et HTTP au profit de SSH et HTTPS ; gestion des clés documentée.

ECART-17 — Aucune évaluation de l'efficacité des mesures

- **Article** : 21(2)(f) · **Maturité** : 0 → 3 · **Délai** : 18 mois
- **Constat** : aucun audit, aucun test d'intrusion, aucun indicateur.
- **Action** : tableau de bord trimestriel présenté au COSSI ; audit de configuration annuel ; test d'intrusion externe annuel sur le périmètre IT ; **audit de segmentation** après la mise en œuvre du bloc 3.

ECART-18 — Documentation d'architecture obsolète

- **Article** : 21(2)(a), (c) · **Maturité** : 1 → 3 · **Délai** : 12 mois
- **Constat** : les schémas réseau datent de 2019 et ne reflètent plus la réalité ; plusieurs liaisons ajoutées depuis ne figurent nulle part.
- **Risque** : en crise, on perd des heures à comprendre son propre réseau.
- **Action** : cartographie à jour, versionnée dans un dépôt Git, **avec une copie papier dans la salle de crise**, revue semestrielle.

---

5. Priorisation

5.1 Matrice impact / effort

```
            EFFORT FAIBLE                EFFORT ELEVE
          +--------------------------+--------------------------+
IMPACT    | 1. A FAIRE TOUT DE SUITE | 2. PROJETS STRUCTURANTS  |
FORT      |  E-02 notification       |  E-01 segmentation IT/OT |
          |  E-05 MFA                |  E-13 journalisation     |
          |  E-04 sauvegardes        |  E-14 detection OT       |
          |  E-06 gouvernance        |  E-03 acces distants     |
          +--------------------------+--------------------------+
IMPACT    | 3. QUAND ON PEUT         | 4. PLUS TARD             |
MODERE    |  E-08 inventaire         |  E-17 audits / tests     |
          |  E-09 revue des comptes  |  E-16 chiffrement complet|
          |  E-12 sensibilisation    |  E-11 refonte contrats   |
          |  E-18 documentation      |                          |
          +--------------------------+--------------------------+
```

5.2 Les 4 actions à mener en priorité absolue

Rang	Écart	Pourquoi en premier	Délai
1	**E-02** procédure de notification	Coût quasi nul, supprime un risque de sanction immédiat	1 mois
2	**E-05** MFA	Meilleur rapport protection / effort de tout le plan	3 mois
3	**E-04** sauvegardes hors ligne	C'est ce qui permet de **survivre** à un rançongiciel	3 mois
4	**E-03** accès distants	Ferme le vecteur d'attaque le plus documenté du secteur	3 mois

> 💡 **Ces quatre actions représentent environ 12 % du budget total** et couvrent une part majoritaire du risque de court terme. C'est l'argument à porter au COSSI dès la première séance.

---

6. La feuille de route

T0 = 1er octobre 2026 (première réunion du COSSI).

Vue d'ensemble

```
2026        2027                                2028
Q4    | Q1     Q2     Q3     Q4        | Q1     Q2     Q3
------+-----------------------------------+-----------------
PHASE 0  |  PHASE 1         |  PHASE 2          |  PHASE 3
Urgences |  Socle           |  Segmentation     |  Maitrise
3 mois   |  6 mois          |  9 mois           |  6 mois
```

🔥 PHASE 0 — Urgences (oct. → déc. 2026)

Objectif : supprimer les risques les plus graves au moindre coût, et poser la gouvernance.

ID	Action	Écart	Responsable	Échéance	Coût 📕	Preuve de clôture
A-01	Créer le COSSI par délibération	E-06	**Direction générale**	31/10/2026	—	Délibération + PV de la 1re séance
A-02	Désigner le RSSI (lettre de mission signée)	E-06	**Direction générale**	31/10/2026	65 k€/an	Lettre de mission
A-03	Créer le compte MonEspaceNIS2 et pré-enregistrer	art. 3(4)	**DSI**	31/10/2026	—	Accusé d'enregistrement
A-04	Rédiger la procédure de notification + 3 modèles + grille de qualification	E-02	**RSSI**	30/11/2026	—	Procédure validée en COSSI, **diffusée sur papier**
A-05	Activer le MFA sur les comptes d'administration et les accès distants	E-05	**DSI**	30/11/2026	8 k€	Capture de configuration + test
A-06	Mettre en place une copie de sauvegarde **hors ligne** hebdomadaire	E-04	**DSI**	15/12/2026	35 k€	Procédure + première bande sortie
A-07	Sauvegarder et versionner **tous les programmes automates**	E-04	**Resp. exploitation**	15/12/2026	5 k€	Dépôt Git + inventaire des programmes
A-08	Supprimer TeamViewer, déployer VPN + MFA + bastion	E-03	**DSI** + prestataire	31/12/2026	45 k€	Configuration + procédure d'intervention
A-09	Constituer l'annuaire de crise **papier** et une messagerie hors domaine	E-02, art. 21(2)(j)	**RSSI**	31/12/2026	2 k€	Annuaire diffusé + test réalisé
A-10	Vérifier l'assujettissement à la directive REC	—	**Juridique**	31/12/2026	—	Réponse écrite de l'autorité

Sous-total phase 0 : ≈ 95 k€ + 65 k€/an (RSSI)

🧱 PHASE 1 — Socle (janv. → juin 2027)

Objectif : savoir ce qu'on protège, et rendre la protection mesurable.

ID	Action	Écart	Responsable	Échéance	Coût 🟥	Preuve de clôture
A-11	Analyse de risques EBIOS RM (IT + OT), 5 scénarios stratégiques	E-07	**RSSI** + cabinet	31/03/2027	35 k€	Rapport EBIOS validé en COSSI
A-12	Rédiger et faire approuver la **PSSI**	E-07	**RSSI**	30/04/2027	—	PSSI + PV d'approbation (art. 20(1))
A-13	Inventaire exhaustif IT et OT	E-08	**DSI** + exploitation	31/03/2027	25 k€	Base d'inventaire + rapprochement terrain
A-14	Revue complète des comptes et des droits, suppression des comptes génériques	E-09	**DSI**	30/04/2027	—	Rapport de revue + 0 compte générique
A-15	Formation cyber des membres de la direction (art. 20(2))	E-12	**RH** + RSSI	31/03/2027	12 k€	**Attestations individuelles**
A-16	Plan annuel de sensibilisation + 1re campagne d'hameçonnage simulé	E-12	**RSSI**	30/06/2027	15 k€	Taux de participation + résultats
A-17	Généraliser le MFA à l'ensemble des utilisateurs	E-05	**DSI**	30/06/2027	18 k€	Taux de couverture > 95 %
A-18	Annexe sécurité type dans les contrats + questionnaire fournisseurs	E-11	**Achats** + RSSI	30/06/2027	—	Annexe validée + 5 contrats critiques renégociés
A-19	Mettre en place la veille CVE et la politique de correctifs IT/OT	E-10	**RSSI**	30/06/2027	8 k€	Procédure + premier rapport mensuel
A-20	Cartographie réseau à jour, versionnée + copie papier en salle de crise	E-18	**DSI**	30/06/2027	10 k€	Schémas datés dans le dépôt
A-21	**Matrice de flux** IT/OT établie et validée par l'exploitation	E-01	**DSI** + exploitation	30/06/2027	20 k€	Matrice signée — **prérequis du bloc 3**

Sous-total phase 1 : ≈ 143 k€

🔒 PHASE 2 — Segmentation (juil. 2027 → mars 2028)

Objectif : le cœur technique du projet — cloisonner l'IT et l'OT sans interrompre le service.

ID	Action	Écart	Responsable	Échéance	Coût 📕	Preuve de clôture
A-22	Acquisition des équipements (2 pare-feu, commutateurs administrables, sonde)	E-01	**DSI**	30/09/2027	180 k€	Bons de livraison
A-23	Créer les VLAN et le routage, **sans filtrage**	E-01	**DSI**	31/10/2027	40 k€	Configurations versionnées
A-24	Déployer la **DMZ industrielle** (relais OPC UA, historian miroir, serveur de MAJ)	E-01	**DSI** + intégrateur	31/12/2027	95 k€	Recette fonctionnelle
A-25	Bascule des équipements par lots, IT puis OT	E-01	**DSI** + exploitation	31/01/2028	30 k€	Journal de bascule, aucun arrêt de service
A-26	Activer le filtrage en **journalisation seule** pendant 2 semaines	E-01	**DSI**	15/02/2028	—	Analyse des flux non prévus
A-27	Passer en **blocage effectif**, zone par zone	E-01	**DSI**	15/03/2028	—	Configurations + tests de segmentation
A-28	Journalisation centralisée + NTP généralisé (12 mois de rétention)	E-13	**DSI**	31/12/2027	55 k€	Taux de couverture > 95 %
A-29	Sonde de détection **passive** sur le réseau OT	E-14	**DSI**	31/01/2028	45 k€	Alertes fonctionnelles + inventaire de référence
A-30	Chiffrement des sauvegardes et des postes nomades, suppression de Telnet	E-16	**DSI**	31/03/2028	15 k€	Rapport de configuration
A-31	**Audit de segmentation** par un tiers	E-01, E-17	**RSSI** + auditeur	31/03/2028	25 k€	🔴 **Rapport d'audit — la preuve maîtresse**

Sous-total phase 2 : ≈ 485 k€

🎯 PHASE 3 — Maîtrise (avr. → sept. 2028)

Objectif : passer de « mis en place » à « mesuré, testé, amélioré » (niveau 4).

ID	Action	Écart	Responsable	Échéance	Coût 📕	Preuve de clôture
A-32	Formaliser le PCA/PRA et les trois modes de fonctionnement	E-15	**Resp. exploitation** + RSSI	30/06/2028	25 k€	PCA validé en COSSI
A-33	**Test de bascule en mode dégradé** en conditions réelles	E-15	**Resp. exploitation**	31/07/2028	10 k€	Compte rendu — distribution maintenue
A-34	**Exercice de crise complet** avec la direction	E-15, art. 23	**RSSI**	31/07/2028	15 k€	Compte rendu + plan d'amélioration
A-35	Test de restauration complet du SCADA en bac à sable	E-04	**DSI**	30/06/2028	8 k€	RTO mesuré < 4 h
A-36	Tableau de bord d'indicateurs trimestriel au COSSI	E-17	**RSSI**	30/04/2028	—	4 tableaux de bord successifs
A-37	Test d'intrusion externe sur le périmètre IT	E-17	**RSSI** + prestataire	30/09/2028	30 k€	Rapport + plan de correction
A-38	**Revue de conformité** à la publication de la loi et des décrets français	art. 5	**Juridique** + RSSI	Déclenchée par la publication	15 k€	Note d'écart au droit national
A-39	Revue annuelle de l'analyse de risques et de la PSSI	E-07	**RSSI**	30/09/2028	—	Version 2 approuvée

Sous-total phase 3 : ≈ 103 k€

---

7. Budget consolidé 📕

Phase	Investissement	Fonctionnement	Total
Phase 0 — Urgences	85 k€	10 k€ + RSSI	**95 k€**
Phase 1 — Socle	55 k€	88 k€	**143 k€**
Phase 2 — Segmentation	380 k€	105 k€	**485 k€**
Phase 3 — Maîtrise	—	103 k€	**103 k€**
Poste RSSI (2 ans)	—	130 k€	**130 k€**
TOTAL 24 mois	**520 k€**	**436 k€**	**≈ 956 k€**

Mise en perspective

Élément de comparaison	Montant
Coût de la mise en conformité (24 mois)	**≈ 956 k€**
Amende maximale encourue (art. 34(4))	**10 000 000 €**
Coût estimé d'un rançongiciel avec perte de la télégestion 📕	1,5 à 4 M€
Chiffre d'affaires annuel	72 M€ (soit **1,3 %** du CA sur 2 ans)
Coût d'une contamination de l'eau distribuée	**Non chiffrable** — santé publique, responsabilité pénale

> 📕 *Les coûts sont des ordres de grandeur construits pour ce cas d'école. Ils doivent être confirmés par des consultations avant tout engagement budgétaire.*

8. Suivi et pilotage

8.1 Gouvernance du plan

Instance	Fréquence	Rôle
COSSI (DG, DSI, RSSI, exploitation, DPO)	Trimestriel	Approuve, arbitre, suit les indicateurs — **matérialise l'art. 20(1)**
Comité de projet	Mensuel	Suit l'avancement des actions
Point hebdomadaire DSI / exploitation	Hebdomadaire	Pendant les phases 0 et 2

8.2 Indicateurs de pilotage

Indicateur	Cible fin 2027	Cible fin 2028
Maturité moyenne art. 21	2,2 / 4	**3,3 / 4**
Écarts critiques ouverts	0	0
Actions du plan réalisées à l'échéance	> 80 %	> 90 %
Taux de couverture MFA	95 %	100 %
Tests de restauration réussis	4 / 4	4 / 4
Flux IT → OT autorisés hors matrice	—	**0**
Comptes prestataires actifs hors intervention	0	0
Dirigeants formés (art. 20(2))	100 %	100 %

8.3 Risques du projet lui-même

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Interruption du service pendant la bascule	Moyenne	🔴 Majeur	Bascule par lots, hors période de pointe, retour arrière préparé, phase « journalisation seule »
Résistance de l'exploitation à la segmentation	**Élevée**	Élevé	Associer l'exploitation **dès la matrice de flux** ; elle valide, elle ne subit pas
Budget non voté	Moyenne	🔴 Majeur	Découpage en phases finançables séparément ; phase 0 à coût quasi nul
Refus de coopération d'un intégrateur	Moyenne	Élevé	Clause contractuelle (A-18) ; calendrier de renégociation
Départ du RSSI	Moyenne	Élevé	Documentation systématique, suppléant désigné
Écart entre la directive et la future loi française	**Élevée**	Moyen	Jalon A-38 déclenché par la publication ; mesures techniques utiles quoi qu'il arrive
Incident majeur **pendant** le plan	Moyenne	🔴 Majeur	C'est précisément pourquoi E-02 (notification) et E-04 (sauvegardes) sont en phase 0

9. Conclusion

HydroRégie présente aujourd'hui une maturité de **0,6 / 4** au regard de l'article 21, avec **6 écarts critiques**, dont l'absence totale de cloisonnement entre l'IT et l'OT et l'absence de procédure de notification.

Le plan proposé porte la maturité à **3,3 / 4 en 24 mois**, pour un budget d'environ **956 k€**, soit **1,3 % du chiffre d'affaires** sur deux ans.

Trois convictions structurent ce plan :

1. **Les quatre premières actions sont quasi gratuites et couvrent l'essentiel du risque immédiat.** Il n'y a aucune raison de les différer.
2. **La segmentation IT/OT est le projet structurant** : elle sert cinq des dix domaines de l'article 21 et c'est elle qui garantit que l'eau continue de couler pendant un incident.
3. **Ne pas attendre la loi française.** Les mesures techniques sont utiles quoi qu'il arrive ; seule la partie déclarative dépend des décrets, et un jalon de revue est prévu pour cela.

📗 Rappel de l'article 21(4) : une entité qui constate un manquement doit prendre **sans délai** les mesures correctives. **Cette analyse d'écart déclenche donc, en elle-même, une obligation d'agir.**

PARTIE 3

Bloc 3 — Architecture réseau segmentée IT / OT

> **Objet** : concevoir et justifier une architecture réseau cloisonnant le système d'information de gestion (IT) et le système industriel (OT) d'HydroRégie, en garantissant la **continuité du service d'eau potable**. **Date** : 10 septembre 2026 · **Version** : 1.0 **Classification** : Diffusion restreinte — 🔴 *ce document décrit le plan d'adressage et les règles de filtrage : il ne doit pas être diffusé hors de l'entité.*


1. Synthèse

Élément	Choix retenu
Référentiel	**IEC 62443** (zones et conduits) + **modèle de Purdue** — conformément à ce que permet l'art. 25
Nombre de zones	**9 zones**, de la criticité « moyenne » à « vitale »
Point de passage IT ↔ OT	**DMZ industrielle** (zone Z5) — aucun flux direct
Pare-feu	**2 pare-feu en cascade** : IT ↔ DMZ, puis DMZ ↔ OT
Protocole de franchissement de zone	**OPC UA** (authentifié et chiffré) — Modbus reste cantonné à l'intérieur de l'OT
Accès distants	**VPN + MFA + bastion**, comptes désactivés par défaut
Sites distants	**WireGuard**, une clé par site, `AllowedIPs` en /32
Détection	Sonde **passive** sur port miroir
Continuité	**3 modes** : nominal, dégradé autonome, manuel — les automates ne dépendent jamais du SCADA

> 🎯 **La règle en une phrase** : *la bureautique ne parle jamais à l'industriel ; l'industriel pousse ses données dans une zone tampon où la bureautique vient les lire.*

2. La situation actuelle et son problème

2.1 L'existant

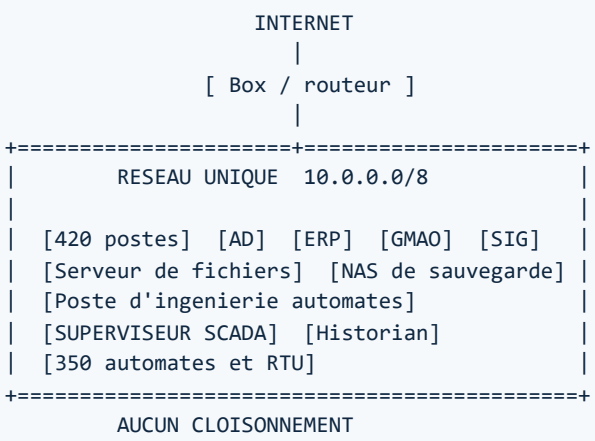

2.2 Le scénario d'attaque que cela permet

Étape	Action de l'attaquant	Ce qui l'arrête aujourd'hui
1	Courriel piégé ouvert par un agent	Antivirus (parfois)
2	Exécution de code sur le poste	**Rien**
3	Découverte du réseau : `nmap` sur 10.0.0.0/8	**Rien**
4	Découverte du superviseur SCADA et des automates	**Rien**
5	Connexion Modbus/TCP (port 502) vers un automate	**Rien** — le protocole n'a pas d'authentification
6	Écriture d'un registre : arrêt d'une pompe, modification d'une consigne de chloration	**Rien**

> 🔴 **Six étapes, aucun obstacle.** C'est la justification technique du projet.

---

3. Le découpage en zones

3.1 Principe

Chaque zone regroupe des équipements de **criticité homogène** et de **besoin de communication similaire**. Entre deux zones, un **conduit** (au sens IEC 62443) : un ensemble de flux explicitement autorisés, filtrés par un pare-feu.

3.2 Les 9 zones

Zone	Nom	VLAN	Réseau	Criticité	Contenu	Niveau Purdue
Z1	Exposition Internet	100	10.100.0.0/24	🟡 Moyenne	Portail abonnés, relais de messagerie, reverse proxy	5
Z2	IT bureautique	110	10.110.0.0/22	🟡 Moyenne	420 postes, AD, serveurs de fichiers, impression	4-5
Z3	IT métier	120	10.120.0.0/24	🟠 Haute	ERP facturation, GMAO, SIG, télérelève	4
Z4	Sauvegarde	130	10.130.0.0/24	🔴 **Critique**	Serveur de sauvegarde, stockage immuable, robot de bandes	—
Z5	**DMZ industrielle**	200	10.200.0.0/24	🔴 **Critique**	Relais OPC UA, historian miroir, serveur de MAJ OT, bastion	**3.5**
Z6	Supervision OT	210	10.210.0.0/24	🟣 **Vitale**	SCADA redondé, historian primaire, serveur d'alarmes	3
Z7	Contrôle OT	220	10.220.0.0/22	🟣 **Vitale**	~350 automates, RTU des sites principaux, IHM locales	1-2
Z8	Sites distants	230	10.230.0.0/22	🟣 **Vitale**	Réservoirs, stations de relevage (VPN sur APN privé)	1-2
Z9	Journalisation	240	10.240.0.0/24	🔴 **Critique**	Collecteur de journaux, supervision, NTP, bastion d'administration	—

> 💡 **Convention d'adressage** : le 2e octet reprend le numéro de VLAN (VLAN 210 → 10.210.x.x). Un an plus tard, on lit une adresse IP et on sait immédiatement dans quelle zone on se trouve. En crise, ce détail fait gagner des minutes.

3.3 Justification du niveau de criticité

Criticité	Critère retenu	Conséquence d'une compromission
🟣 **Vitale**	Le procédé de production et de distribution d'eau en dépend	**Arrêt de la distribution ou altération de la qualité de l'eau** → santé publique
🔴 **Critique**	Sa compromission permet d'atteindre une zone vitale, ou empêche la reprise	Perte de la capacité de reconstruire (Z4) ou de contrôler (Z5, Z9)
🟠 **Haute**	Données sensibles, service aux usagers	Fuite de données abonnés (RGPD), interruption de facturation
🟡 **Moyenne**	Exposé mais sans effet direct sur le procédé	Interruption bureautique

4. Le schéma d'architecture cible

4.1 Vue d'ensemble

```
flowchart TB
    NET(("Internet"))

    subgraph EXPO["Z1 - Exposition  VLAN 100  10.100.0.0/24"]
        PORTAIL["Portail abonnes<br/>Reverse proxy"]
    end

    subgraph IT["ZONE IT - niveaux Purdue 4 et 5"]
        BUR["Z2 - IT bureautique<br/>VLAN 110 - 10.110.0.0/22<br/>420 postes, AD"]
        MET["Z3 - IT metier<br/>VLAN 120 - 10.120.0.0/24<br/>ERP, GMAO, SIG"]
        SAV["Z4 - Sauvegarde<br/>VLAN 130 - 10.130.0.0/24<br/>Stockage immuable"]
    end

    FW1{{"PARE-FEU 1<br/>IT vers DMZ"}}

    subgraph DMZ["Z5 - DMZ INDUSTRIELLE  VLAN 200  10.200.0.0/24  -  niveau 3.5"]
        OPC["Relais OPC UA<br/>lecture seule"]
        HIST2["Historian miroir"]
        MAJ["Serveur de mises a jour OT"]
        BAS["Bastion<br/>enregistrement de session"]
    end

    FW2{{"PARE-FEU 2<br/>DMZ vers OT"}}

    subgraph OT["ZONE OT - niveaux Purdue 1 a 3"]
        SCADA["Z6 - Supervision<br/>VLAN 210 - 10.210.0.0/24<br/>SCADA redonde, historian"]
        AUTO["Z7 - Controle<br/>VLAN 220 - 10.220.0.0/22<br/>350 automates, IHM"]
        DIST["Z8 - Sites distants<br/>VLAN 230 - 10.230.0.0/22<br/>Reservoirs, relevage"]
    end

    PROC["NIVEAU 0 - PROCEDE<br/>Pompes, vannes, chloration, capteurs"]

    ADM["Z9 - Journalisation<br/>VLAN 240 - 10.240.0.0/24<br/>Journaux, supervision, NTP, bastion"]

    NET --> PORTAIL
    PORTAIL -->|443 uniquement| MET
    BUR --> FW1
    MET -->|4840 OPC UA lecture| FW1
    FW1 --> OPC
    SCADA -->|4840 OPC UA<br/>l OT POUSSE| FW2
    FW2 --> OPC
    SCADA -->|502 Modbus<br/>2404 IEC-104| AUTO
    SCADA -->|VPN WireGuard| DIST
    AUTO --> PROC
    DIST --> PROC
    BAS -->|22 / 3389 tracés| FW2
    SAV -.->|sauvegarde| MET
    OT -.->|syslog TLS 6514| ADM
    DMZ -.->|syslog TLS 6514| ADM
    IT -.->|syslog TLS 6514| ADM

    BUR x--x OT
```

⛔ La dernière liaison du schéma (`BUR x--x OT`) matérialise **l'interdiction centrale** : aucun flux, jamais, entre la bureautique et l'industriel.

4.2 Vue en couches (modèle de Purdue)

```
INTERNET
   |
   | 443 sortant / entrant filtre
   v
+-------------------------------------------------------------+
| Z1 EXPOSITION      VLAN 100   Portail abonnes, relais mail    |  Niveau 5
+-------------------------------------------------------------+
| Z2 IT BUREAUTIQUE  VLAN 110   Postes, AD, fichiers            |  Niveau 4-5
| Z3 IT METIER       VLAN 120   ERP, GMAO, SIG                  |  Niveau 4
| Z4 SAUVEGARDE      VLAN 130   Stockage immuable               |
+=============================================================+
|                    PARE-FEU 1  (IT <-> DMZ)                  |
+=============================================================+
| Z5 DMZ INDUSTRIELLE  VLAN 200                                 |  Niveau 3.5
|    Relais OPC UA (lecture seule)                              |
|    Historian miroir | Serveur de MAJ OT | BASTION             |
+=============================================================+
|                    PARE-FEU 2  (DMZ <-> OT)                  |
+=============================================================+
| Z6 SUPERVISION OT  VLAN 210   SCADA redonde, historian        |  Niveau 3
+-------------------------------------------------------------+
| Z7 CONTROLE OT     VLAN 220   350 automates, IHM locales      |  Niveau 1-2
| Z8 SITES DISTANTS  VLAN 230   Reservoirs, stations (VPN)      |  Niveau 1-2
+-------------------------------------------------------------+
| NIVEAU 0  PROCEDE   Pompes, vannes, chloration, capteurs      |  Niveau 0
+-------------------------------------------------------------+

Z9 JOURNALISATION  VLAN 240 : collecteur de journaux, NTP, bastion d'administration
   -> recoit de TOUTES les zones, n'envoie vers AUCUNE
   -> seule sortie : le bastion, en session enregistree (F-11)
```

---

5. La matrice de flux

> 🔑 **C'est le vrai livrable technique.** Le schéma illustre ; la matrice se met en œuvre. Principe : **DENY par défaut**, chaque ligne est une exception **justifiée** et **validée**.

5.1 Flux autorisés

#	Source	Destination	Port / protocole	Sens	Justification métier	Validé par
F-01	Internet	Z1 portail	443/TCP	→	Accès des abonnés à leur espace	DSI
F-02	Z1 portail	Z3 ERP	443/TCP	→	Consultation des factures	DSI
F-03	Z2 bureautique	Z3 métier	443/TCP, 1433/TCP	→	Usage de l'ERP et de la GMAO	DSI
F-04	Z3 métier (GMAO)	Z5 relais OPC UA	4840/TCP	→	Remontée des compteurs horaires des pompes pour la maintenance préventive	Exploitation
F-05	Z3 métier (SIG)	Z5 historian miroir	1433/TCP	→	Cartographie des débits et pressions	Exploitation
F-06	**Z6 SCADA**	**Z5 relais OPC UA**	4840/TCP	→	🔑 **L'OT pousse** ses données vers la DMZ	Exploitation
F-07	Z6 historian	Z5 historian miroir	1433/TCP	→	Réplication de l'historique	Exploitation
F-08	**Z6 SCADA**	**Z7 automates**	502/TCP, 2404/TCP	→	🔑 Pilotage — **seul** flux autorisé vers les automates	Exploitation
F-09	Z6 SCADA	Z8 sites distants	2404/TCP dans tunnel WireGuard	→	Télégestion des réservoirs et stations	Exploitation
F-10	Z8 sites distants	Z6 SCADA	2404/TCP dans tunnel	→	Remontée des mesures et alarmes	Exploitation
F-11	Z9 bastion	Z5, Z6, Z7	22/TCP, 3389/TCP	→	Administration **depuis le bastion uniquement**, session enregistrée	RSSI
F-12	Z5 serveur MAJ	Z6, Z7	445/TCP, 8530/TCP	→	Distribution des correctifs OT en fenêtre planifiée	Exploitation
F-13	Z5 serveur MAJ	Internet	443/TCP	→	Téléchargement des correctifs — **sortant, initié depuis la DMZ**	DSI
F-14	Toutes zones	Z9 collecteur	6514/TCP (syslog TLS)	→	Journalisation centralisée (art. 21(2)(b))	RSSI
F-15	Toutes zones	Z9 serveur NTP	123/UDP	→	Synchronisation horaire — **prérequis de toute chronologie de crise**	RSSI
F-16	Z2, Z3	Z4 sauvegarde	Port de l'agent de sauvegarde	→	Sauvegarde — **initiée par le serveur de sauvegarde**	DSI
F-17	VPN prestataires	Z9 bastion	443/TCP	→	Accès distant, après MFA, **sur activation**	RSSI

5.2 Flux explicitement interdits

#	Source	Destination	Port	Justification du blocage
D-01	**Z2 IT bureautique**	**Z5, Z6, Z7, Z8**	**tout**	🔴 **RÈGLE CENTRALE** — la bureautique ne parle jamais à l'industriel ni à la DMZ
D-02	Z7, Z8 automates	Internet	tout	Un automate n'a rien à faire sur Internet
D-03	**Z5 DMZ**	**Z7, Z8 automates**	tout	La DMZ ne doit jamais devenir un tremplin vers le procédé
D-04	Internet	Z5, Z6, Z7, Z8	tout entrant	Aucun flux entrant vers l'industriel, sans exception
D-05	Z1 exposition	Z2, Z4	tout	Un portail compromis n'atteint ni la bureautique ni les sauvegardes
D-06	Toute zone	Z4 sauvegarde	tout sauf agent de sauvegarde	🔴 Protection des sauvegardes contre le chiffrement
D-07	Z5 DMZ	Z2, Z3	tout (sens DMZ → IT)	La DMZ ne se connecte pas à l'IT : l'IT vient lire
D-08	Z9 journalisation	Internet	tout	La zone de journalisation reste hors ligne
D-09	Z7	Z6	tout initié par un automate	Un automate compromis ne remonte pas vers le SCADA
D-10	**any**	**any**	**tout**	🔴 **DENY ALL journalisé — dernière règle de chaque interface**

> 💡 **Pourquoi écrire D-01 explicitement, alors que D-10 bloque déjà tout ?** Pour la **journalisation** et la **preuve**. Une règle nommée produit une ligne de journal identifiable, exploitable en détection (art. 21(2)(b)) et comme preuve lors d'un contrôle (art. 32(2)).

---

6. Justification des choix techniques

6.1 Pourquoi deux pare-feu et pas un seul

Option	Avantage	Inconvénient	Décision
Un seul pare-feu multi-interfaces	Coût réduit, administration simple	Une compromission = toute la segmentation tombe	❌ Écartée
Deux pare-feu en cascade	Défense en profondeur ; jeux de règles et administrateurs distincts	Coût et exploitation doublés	✅ **Retenue**
Deux pare-feu de **constructeurs différents**	Une vulnérabilité ne touche pas les deux	Deux compétences à maintenir, coût de formation	🟡 **Non retenue en phase 1**

📕 **Décision assumée** : deux pare-feu **de même constructeur**, mais avec des **jeux de règles séparés**, des **comptes d'administration distincts** et des **cycles de mise à jour décalés**. Compromis entre sécurité et capacité d'exploitation d'une équipe de trois personnes. **À réévaluer** au renouvellement. C'est exactement le raisonnement de proportionnalité de l'art. 21(1) — et le fait de l'écrire est ce qui le rend défendable.

6.2 Pourquoi OPC UA pour franchir la frontière de zone

Critère	Modbus/TCP	
Authentification	❌ Aucune	✅ Certificats et comptes
Chiffrement	❌ Aucun	✅ `Sign` / `SignAndEncrypt`
Contrôle d'accès fin	❌ Non	✅ Par nœud, lecture seule possible
Traçabilité	❌ Non	✅ Journalisation applicative

compensée par l'isolement réseau. **Aucune frontière de zone n'est franchie en Modbus.**

6.3 Pourquoi une DMZ plutôt qu'un flux direct filtré

Un flux direct Z3 → Z6, même restreint au port 4840, laisserait subsister une **session de bout en bout** entre l'IT et l'OT. Une vulnérabilité du serveur OPC du SCADA serait alors exploitable depuis l'IT.

Avec la DMZ : la session de l'IT **se termine sur le relais**. Pour atteindre le SCADA, un attaquant devrait compromettre le relais **puis** trouver un chemin retour — que **D-03** interdit et que le sens des flux rend inexistant (c'est l'OT qui pousse).

6.4 Pourquoi pas de diode réseau en phase 1

	Pour	Contre
Diode de données	Garantie **matérielle** d'unidirectionnalité	30 à 80 k€ 📕, télémaintenance impossible par ce canal, protocoles spécifiques

📕 **Décision** : non retenue en phase 1. Le gain marginal par rapport à une DMZ correctement configurée ne justifie pas le coût au regard des autres priorités (MFA, sauvegardes, détection), qui couvrent des risques plus probables. **À réévaluer** si un flux temps réel devait être ouvert vers un tiers externe (délégataire, autorité). *Décision et motif tracés — art. 21(1).*

6.5 Pourquoi WireGuard pour les sites distants

Solution	Verdict
APN privé 4G seul	❌ Insuffisant : isole d'Internet mais ne chiffre pas de bout en bout et ne protège pas d'un équipement voisin compromis
IPsec	🟡 Fonctionnel mais lourd à configurer sur 60+ sites
WireGuard	✅ **Retenu** : léger (adapté aux RTU), rapide à remonter après coupure, une **clé par site**

```
# Concentrateur : une cle publique et UN SEUL hote autorise par site
[Peer]
PublicKey  = <cle-publique-reservoir-nord>
AllowedIPs = 10.230.1.12/32        # /32 : un site compromis ne peut pas usurper un autre site
PersistentKeepalive = 25
```

> 🔑 **Le `/32` est le détail qui compte.** Mettre `10.230.0.0/22` permettrait à un site compromis d'usurper l'adresse de n'importe quel autre site.

6.6 Pourquoi une sonde passive et non un système de blocage

Un équipement de blocage en coupure (IPS) sur un réseau industriel peut, sur un faux positif, **interrompre une régulation** — donc la distribution d'eau. En OT, la **sûreté prime**.

par les pare-feu, dont les règles sont statiques et testées.

7. La continuité du service d'eau potable

📗 Exigence de l'**article 21(2)(c)** : continuité des activités et gestion de crise.

> 🔴 **Exigence directrice de toute l'architecture** : **l'eau doit continuer de couler même si la totalité de l'informatique est arrêtée.**

7.1 Les trois modes de fonctionnement

Mode	Déclencheur	Ce qui fonctionne	Ce qu'on perd	Durée tenable 📕
Nominal	—	Télégestion complète, optimisation énergétique, alarmes centralisées	—	—
Dégradé — autonomie locale	SCADA indisponible **ou isolé volontairement**	Les **automates régulent seuls** : niveau, pression, chloration asservie au débit. IHM locales sur site	Vision centralisée, optimisation, alarmes à distance	**Plusieurs jours**
Manuel	Automate hors service ou site inaccessible	Manœuvres humaines, dosage vérifié par **prélèvements** toutes les 4 h	Réactivité, précision ; charge en personnel très élevée	**Quelques jours** avec renfort

7.2 Les décisions d'architecture qui en découlent

#	Exigence	Pourquoi
1	🔴 **Les automates embarquent une logique de repli autonome** et ne dépendent **jamais** du SCADA pour maintenir le service	C'est ce qui permet de **couper le lien IT/OT en 5 minutes** sans arrêter l'eau
2	Une **IHM locale** est présente sur chaque site majeur	Exploitation possible sans le réseau
3	Les **réservoirs** disposent d'une autonomie de plusieurs heures	Temps tampon pour réagir
4	Le lien Z6 ↔ Z7 est **coupable physiquement** (procédure documentée, testée)	La coupure est une **décision d'exploitation**, pas une opération d'urgence improvisée
5	La logique de sûreté (seuils critiques, arrêts de sécurité) est **câblée**, pas seulement logicielle	Une logique logicielle corrompue ne doit pas pouvoir déclencher un incident de sécurité
6	Cette exigence est **écrite dans les cahiers des charges** des intégrateurs	Art. 21(2)(d) — chaîne d'approvisionnement
7	Elle est **testée une fois par an** en conditions réelles	Art. 21(2)(f) — évaluation de l'efficacité

7.3 Le scénario « on coupe tout » — chronométré 📕

```
T+0 min    Suspicion de propagation vers l'OT
T+5 min    Decision : couper le lien Z5 <-> Z6 (responsable exploitation + RSSI)
T+10 min   Lien coupe. Les automates passent en autonomie locale.
           >>> LA DISTRIBUTION D'EAU N'EST PAS INTERROMPUE <<<
T+30 min   Astreinte deployee sur les 2 usines et les 4 sites sensibles
T+2 h      Surveillance par IHM locales et rondes ; frequence des releves : 2 h
T+24 h     Mode degrade stabilise ; traitement de l'incident IT en parallele
J+3        Verification d'integrite des automates avant reconnexion progressive
```

> 🎯 **C'est le point qui distingue ce rendu.** La question n'est pas « comment empêcher l'attaque ? » mais « **comment continuer à distribuer de l'eau pendant l'attaque ?** ».

8. Mise en œuvre : la migration sans coupure

Étape	Action	Durée 📕	Risque	Retour arrière
1	**Cartographie passive** des flux réels (4 semaines, incluant un week-end et une astreinte)	1 mois	Nul	—
2	Rédaction de la **matrice de flux**, **validée par l'exploitation**	1 mois	Nul	—
3	Création des VLAN et du routage, **sans filtrage**	1 mois	Faible	Retour au VLAN unique
4	Bascule des équipements **par lots**, IT d'abord, OT ensuite	3 mois	Modéré	Re-basculement du lot
5	Filtrage en **journalisation seule** (2 semaines)	2 sem.	Faible	Aucune règle bloquante
6	Passage en **blocage**, zone par zone, de la moins critique à la plus critique	1 mois	Maîtrisé	Retour en journalisation seule
7	**Audit de segmentation** par un tiers	2 sem.	Nul	—

> 🔑 **L'étape 5 est celle qu'on est tenté de sauter.** Elle révèle les flux non documentés — sonde de qualité qui émet en direct, imprimante de laboratoire, licence flottante d'un logiciel métier — **avant** de casser quoi que ce soit.

Règles d'or de la migration

1. **Jamais de bascule un vendredi** ni la veille d'un jour férié.
2. **Jamais pendant une pointe de consommation** (été, épisode de forte chaleur).
3. **L'exploitation a un droit de veto** sur toute fenêtre de bascule.
4. **Un retour arrière testé** avant chaque étape, pas seulement écrit.

---

9. Ce que l'architecture change, mesuré

Scénario	Avant	Après
Poste bureautique compromis atteint un automate	✅ En 3 étapes	⛔ **Bloqué** par D-01 (journalisé et alerté)
Rançongiciel chiffre le SCADA	✅ Possible	🟡 Possible, mais **l'eau continue de couler** (mode dégradé)
Rançongiciel chiffre les sauvegardes	✅ Possible	⛔ **Bloqué** par D-06 + copie hors ligne
Intégrateur compromis atteint tous les automates	✅ Possible	🟡 Limité au périmètre du ticket, session enregistrée
Automate compromis exfiltre vers Internet	✅ Possible	⛔ **Bloqué** par D-02
Attaquant efface ses traces	✅ Possible	⛔ Journaux poussés en Z9, isolée
Reconnaissance réseau depuis la bureautique	✅ Tout le SI visible	🟡 Seule la zone Z2 est visible

Couverture des mesures de l'article 21

Domaine	Contribution de l'architecture
21(2)(a)	Les zones traduisent l'analyse de risques en découpage technique
21(2)(b)	**Contention** de l'incident + journalisation centralisée pour la détection
21(2)(c)	**Continuité de la distribution** garantie par les modes dégradés
21(2)(e)	**Mesure compensatoire** pour les automates non corrigeables
21(2)(h)	OPC UA chiffré aux frontières, VPN chiffrés
21(2)(i)	Point de passage unique et tracé pour l'administration
21(2)(j)	MFA sur tous les accès distants, bastion, communication d'urgence hors domaine

10. Limites et points d'attention

Un rendu honnête dit aussi ce qu'il ne fait pas.

Limite	Portée	Traitement prévu
La segmentation **ne protège pas** contre un poste d'ingénierie légitime compromis	Un administrateur OT reste un point de défaillance	Bastion, MFA, moindre privilège, surveillance des sessions
Les automates restent **vulnérables** en eux-mêmes	Protocoles sans authentification	Isolement + détection + remplacement progressif
L'attaque par **clé USB** contourne le réseau	Poste d'ingénierie, mises à jour terrain	Poste de décontamination, procédure, sensibilisation
La DMZ devient un **point de concentration**	Si elle tombe, la remontée de données s'arrête	Durcissement renforcé, supervision, mais l'OT reste protégé par D-03
Coût d'exploitation de deux pare-feu	Charge sur une équipe de 3 personnes	Formation, procédures, automatisation des sauvegardes de configuration
Les **60 000 compteurs communicants** ne sont pas traités ici	Périmètre distinct (télérelève radio)	À traiter dans une phase ultérieure — **écart assumé et documenté**

11. Conclusion

L'architecture proposée cloisonne l'IT et l'OT en **9 zones** de criticité homogène, séparées par **deux pare-feu en cascade** et une **DMZ industrielle** qui constitue le seul point de rencontre entre les deux mondes. Aucun flux direct entre la bureautique et l'industriel n'est autorisé, et le seul protocole franchissant une frontière de zone est **OPC UA**, imposé en mode **SignAndEncrypt** — signé et chiffré ; en mode *None*, OPC UA n'apporterait aucune protection.

Trois principes la résument :

1. **Personne ne traverse.** L'OT pousse, l'IT lit — dans une zone tampon.
2. **Tout est justifié.** Chaque ligne de la matrice porte une justification métier et un validateur.
3. **L'eau coule quand même.** Les automates régulent seuls, et couper le lien IT/OT est une décision d'exploitation de cinq minutes, testée une fois par an.

Fichiers techniques associés

Fichier	Contenu
`scripts/reseau/vlan-switch.cfg`	Configuration type des commutateurs
`scripts/pare-feu/nftables-segmentation.nft`	Règles de filtrage complètes
`scripts/reseau/wireguard-site-distant.conf`	Tunnel type d'un site distant
`scripts/verification/test-segmentation.sh`	Script de test de la segmentation
`schemas/architecture-avant.png`	L'existant : réseau plat
`schemas/architecture-cible.svg` · `.png`	**La cible** : 9 zones, 2 pare-feu, DMZ, légende et niveaux de criticité

PARTIE 4

Bloc 4 — Chronologie de gestion de crise et notifications réglementaires

> **Objet** : dérouler une crise cyber de bout en bout chez HydroRégie et produire les notifications exigées par l'article 23 de la directive (UE) 2022/2555. **Date** : 10 septembre 2026 · **Version** : 1.0 **Classification** : Diffusion restreinte

⚠️ Nature de ce document

📕 **Le scénario ci-dessous est fictif.** Il est construit pour ce cas d'école et sert de base à l'exercice de crise annuel (action A-34 de la feuille de route). Les notifications rédigées en annexe sont des **modèles remplis avec les données du scénario** : elles montrent le format, le niveau de détail et le respect des délais.

Positionnement dans le plan : le scénario est daté de **mars 2027**, c'est-à-dire **après la phase 0** (procédure de notification, MFA, sauvegardes hors ligne, bastion — réalisés fin 2026) mais **avant la segmentation IT/OT** (achevée en mars 2028). C'est volontaire : cela permet de montrer ce que les mesures déjà en place ont sauvé, **et** ce que la segmentation aurait évité.

1. Le scénario

Élément	Valeur
Date	Mardi **16 mars 2027**
T0 (connaissance de l'incident)	**04 h 12**
Type	Rançongiciel sur le système d'information de gestion, avec tentative de propagation vers l'OT
Vecteur initial	Compte d'un prestataire de maintenance bureautique, compromis par hameçonnage ciblé, utilisé 9 jours plus tôt pour un premier accès
Périmètre touché	Active Directory, serveurs de fichiers, ERP de facturation, GMAO, messagerie
Périmètre menacé	Superviseur SCADA (réseau non encore segmenté)
Impact sur la distribution d'eau	⚠️ **Aucune interruption** — bascule en mode dégradé autonome
Usagers concernés	240 000 abonnés (facturation), 450 000 habitants (service)

2. La chronologie détaillée

🔴 Phase 1 — Détection (T0 à T+30 min)

Heure	Acteur	Fait	Décision / action
04 h 12	Astreinte exploitation	Alarmes multiples sur le SCADA : perte de liaison avec l'historian. Les postes bureautiques du siège sont inaccessibles	🔴 **T0 — ouverture de la main courante**, horodatée
04 h 15	Astreinte	Constat visuel : messages de rançon sur deux serveurs	Appel immédiat au responsable d'astreinte DSI
04 h 22	Responsable DSI	Confirme : chiffrement en cours sur le serveur de fichiers et l'ERP	Appel du RSSI
04 h 30	RSSI	Prend la main. Vérifie l'état du SCADA : **encore opérationnel**	Décision : **couper immédiatement le lien IT ↔ OT**

> 🔑 **La décision de 04 h 30 est la plus importante de toute la crise.** Le réseau n'étant pas encore segmenté, la coupure est **physique** : débranchement du lien montant du commutateur desservant la zone de supervision, selon la procédure préétablie.

🟠 Phase 2 — Qualification et confinement (T+30 min à T+3 h)

Heure	Acteur	Fait	Décision / action
04 h 45	DSI + exploitation	**Lien IT ↔ OT physiquement coupé**	✅ **Les automates passent en autonomie locale. La distribution d'eau n'est pas interrompue**
05 h 00	RSSI	Applique la grille de qualification (art. 23(3))	🔴 **Incident qualifié IMPORTANT** — perturbation opérationnelle grave + données de 240 000 abonnés potentiellement affectées
05 h 10	RSSI	Appelle le directeur général	**Activation de la cellule de crise**
05 h 30	Cellule de crise	Réunion physique en salle de crise. Communication par la messagerie **hors domaine** et l'annuaire papier	Répartition des rôles, désignation du secrétaire de crise
06 h 00	DSI	Isolement complet : coupure de l'accès Internet, arrêt des serveurs non chiffrés, déconnexion du site de sauvegarde	Confinement
06 h 15	DSI	**Vérification des sauvegardes hors ligne** : la bande du vendredi 12 mars est intacte, sortie du robot	✅ **La restauration est possible**
06 h 30	RSSI	Appel au **CERT-FR** (art. 11) pour assistance technique	Prise en charge, conseils de préservation des preuves
07 h 00	RSSI + DSI	**Images disque** des trois serveurs les plus touchés, **avant toute réinstallation**	✅ Préservation des preuves
07 h 30	Exploitation	Déploiement de l'astreinte renforcée sur les 2 usines et 4 sites sensibles	Mode dégradé stabilisé

🟡 Phase 3 — Escalade et notification (T+3 h à T+24 h)

Heure	Acteur	Fait	Décision / action
08 h 00	Cellule de crise	Premier point de situation formel	Décision : notification à l'autorité **dans la journée**, sans attendre l'échéance
08 h 30	DPO	Confirme que des données personnelles d'abonnés sont concernées	🔴 **Double notification : ANSSI + CNIL**
09 h 00	Communication	Rédaction du message aux usagers et du message aux agents	Validation par le DG
10 h 00	Direction générale	Information de l'autorité organisatrice et de la préfecture	—
11 h 00	Juridique	Préparation du **dépôt de plainte**	Plainte déposée le 17/03
11 h 30	Cellule	Déclaration à l'assureur cyber	—
14 h 30	**RSSI → DG → envoi**	🔴 **ALERTE PRÉCOCE transmise à l'autorité** (art. 23(4)(a))	✅ **T0 + 10 h 18 — délai de 24 h respecté avec 13 h 42 de marge**
15 h 00	Communication	Message publié sur le site institutionnel et les réseaux sociaux (art. 23(1))	Information des usagers
16 h 00	CERT-FR	Retour dans les 24 h prévu par l'art. 23(5) : orientations techniques, indicateurs de compromission à rechercher	Assistance
18 h 00	Cellule	Point de situation. **Organisation de la relève** : deux équipes en alternance 12 h	Éviter l'épuisement
22 h 00	DSI	Souche du rançongiciel identifiée avec l'aide du CERT-FR	Recherche du point d'entrée

🟢 Phase 4 — Remédiation (J+1 à J+10)


Date	Fait marquant
Mercredi 17/03	Point d'entrée identifié : compte prestataire compromis, première connexion le 07/03 à 23 h 41. Dépôt de plainte. Début de la reconstruction d'un environnement d'accueil **sain** (nouveaux serveurs, nouvel Active Directory)
Jeudi 18/03 — 17 h 00	🔴 **NOTIFICATION D'INCIDENT transmise à l'autorité** (art. 23(4)(b)) — **T0 + 60 h 48, délai de 72 h respecté**. Notification CNIL transmise en parallèle (art. 33 RGPD)
Vendredi 19/03	Restauration de l'Active Directory sur socle neuf. Réinitialisation de **tous** les mots de passe. MFA vérifié sur l'ensemble des comptes
Samedi 20/03	Restauration de l'ERP de facturation. Perte constatée : **14 heures** de données de gestion (RPO respecté : 24 h)
Lundi 22/03	Vérification d'intégrité des automates et du SCADA par l'intégrateur : **aucune modification de programme ni de consigne détectée** ✅
Mardi 23/03	Reconnexion **progressive** du lien IT ↔ OT, sous surveillance renforcée. Retour au mode nominal
Vendredi 26/03	Rétablissement de la messagerie et du portail abonnés. Fin de la cellule de crise
Mardi 30/03	Retour d'expérience à chaud avec l'ensemble des participants

📄 Phase 5 — Clôture

Date	Action
Jeudi 15/04/2027	🔴 **RAPPORT FINAL transmis à l'autorité** (art. 23(4)(d)) — **28 jours après la notification du 18/03, délai d'un mois respecté**
20/04/2027	Présentation du retour d'expérience et du plan d'amélioration au COSSI (art. 20(1))
30/04/2027	Mise à jour de l'analyse de risques et de la PSSI (art. 21(4))

---

3. La frise des délais réglementaires

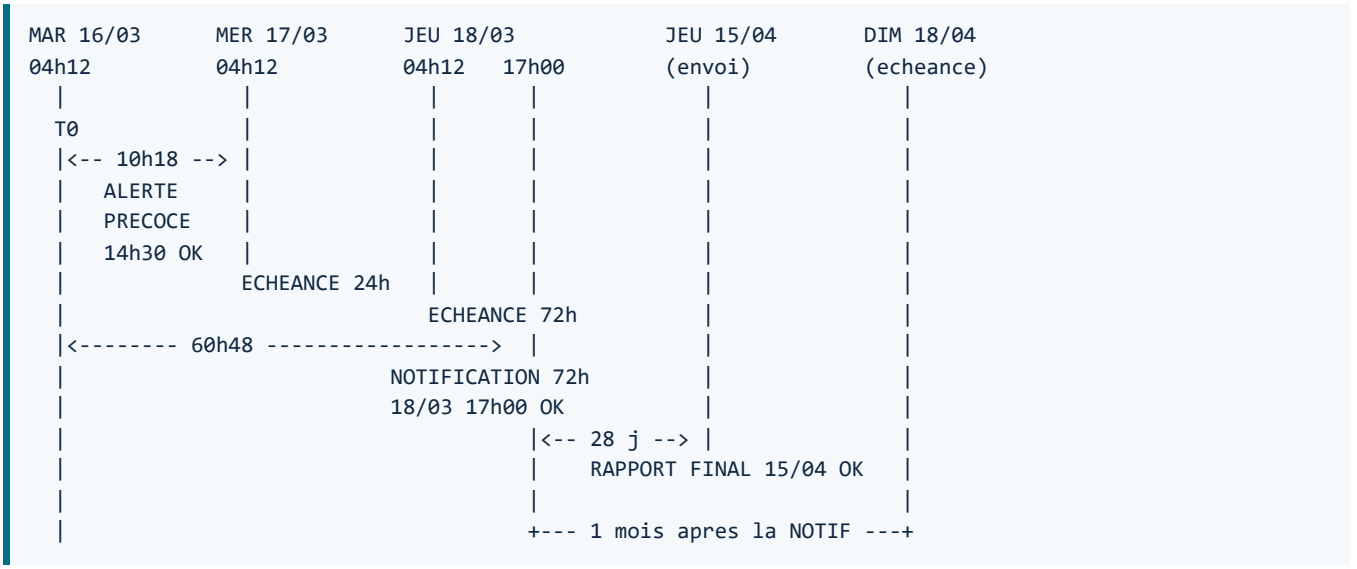

> 🔴 **Le point que tout le monde rate** : le mois du rapport final court à compter de la **notification des 72 h** (18/03), **pas** de T0 (16/03). Échéance : 18/04/2027. Envoyé le 15/04.

---

4. Les notifications rédigées


Les trois notifications réglementaires, remplies avec les données du scénario, sont en annexe :

Document	Article	Échéance	Envoyé	Fichier
Alerte précoce	23(4)(a)	17/03 04 h 12	**16/03 14 h 30** ✅	A-alerte-precoce-24h.md
Notification d'incident	23(4)(b)	19/03 04 h 12	**18/03 17 h 00** ✅	B-notification-72h.md
Rapport final	23(4)(d)	18/04	**15/04** ✅	C-rapport-final-1-mois.md
Information des usagers	23(1)	Sans retard injustifié	16/03 15 h 00	D-information-usagers.md
Notification CNIL	art. 33 RGPD	19/03	18/03 17 h 30	E-notification-cnil.md

---

5. L'organisation de crise

5.1 Les deux cellules

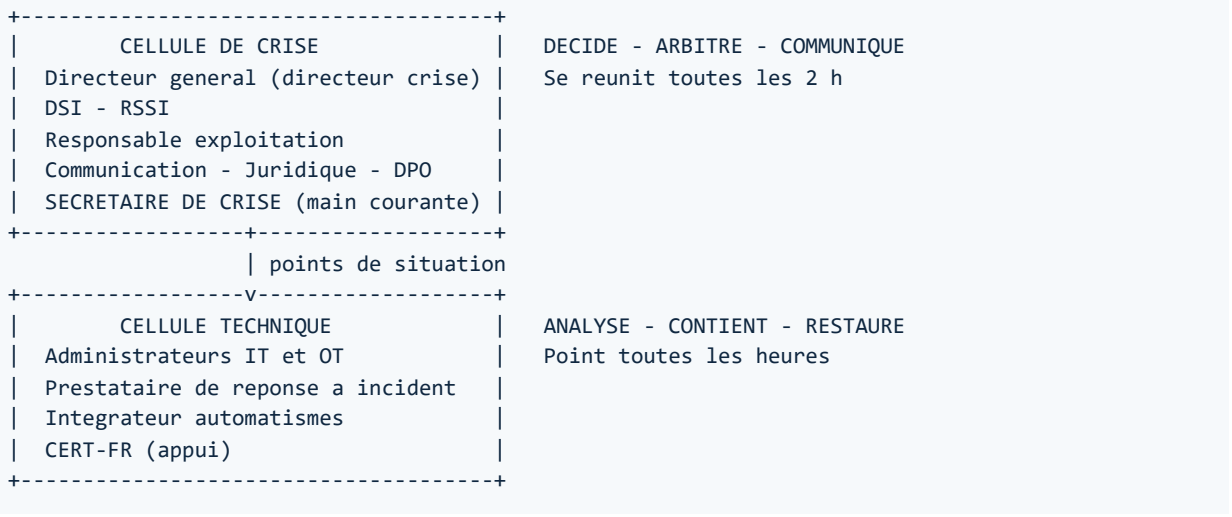

5.2 Qui fait quoi

Rôle	Titulaire	Responsabilité	Ne fait pas
Directeur de crise	Directeur général	Décide, arbitre, engage l'entité, valide les notifications	Ne fait pas de technique
RSSI	RSSI	Qualifie l'incident, rédige les notifications, relation CERT-FR	Ne décide pas seul de notifier
DSI	DSI	Pilote la cellule technique, confinement, restauration	—
Exploitation	Responsable exploitation	🔴 **Garantit la continuité de la distribution d'eau**	—
Communication	Chargé de communication	Usagers, presse, élus, agents	N'improvise pas
DPO	DPO	Volet RGPD, notification CNIL	—
Juridique	Service juridique	Plainte, assurance, contrats	—
Secrétaire de crise	Assistant de direction	**Main courante horodatée**	Ne participe pas aux décisions

> 🔑 **Le secrétaire de crise est le poste le plus sous-estimé.** Sans main courante, le rapport final de l'article 23(4)(d) est impossible à écrire un mois plus tard, et le respect des délais est indémontrable.

5.3 Extrait de la main courante

Heure	Source	Fait constaté	Décision	Qui
04:12	Astreinte exploitation	Alarmes SCADA multiples ; postes du siège inaccessibles	Ouverture main courante — **T0**	Astreinte
04:15	Astreinte	Messages de rançon sur SRV-FIC-01 et SRV-ERP-02	Appel DSI	Astreinte
04:30	RSSI	SCADA opérationnel, pas de trace de compromission OT	**Couper le lien IT/OT**	RSSI
04:45	DSI	Lien coupé (débranchement SW-CORE-02 port 24)	Automates en autonomie locale	DSI
05:00	RSSI	Grille de qualification appliquée	**Incident important** — notification requise	RSSI
06:15	DSI	Bande de sauvegarde du 12/03 intacte, hors ligne	Restauration possible	DSI
14:30	RSSI	Alerte précoce transmise, accusé n° AR-2027-0316-1430	—	DG

> Règle : **on n'efface jamais**. Une correction est une nouvelle ligne.

---

6. La grille de qualification appliquée

📗 Art. 23(3) : un incident est important s'il **a causé ou est susceptible de causer** une perturbation opérationnelle grave ou des pertes financières, **ou** s'il **a affecté ou est susceptible d'affecter** des tiers en causant des dommages considérables.

Question	Réponse le 16/03 à 05 h 00	Conclusion
La distribution ou la qualité de l'eau est-elle affectée, ou **susceptible** de l'être ?	Pas affectée, mais **susceptible** de l'être (propagation vers l'OT non exclue à cet instant)	✅ Critère (a)
Le SCADA ou des automates sont-ils indisponibles ou suspectés compromis ?	SCADA préservé, mais suspicion non levée	✅ Critère (a)
Un service à l'usager est-il interrompu plus de 4 h ?	Oui — facturation, portail abonnés, accueil téléphonique	✅ Critère (a)
Des données personnelles d'abonnés sont-elles concernées ?	Oui — 240 000 abonnés	✅ Critère (b) + RGPD
L'incident est-il d'origine malveillante ?	Oui — rançongiciel avéré	✅
Pertes financières estimées	> seuil défini par la direction	✅ Critère (a)

> ✅ **Décision : incident important.** Notification requise au titre de l'article 23. ⏱️ Qualification prononcée à **T0 + 48 minutes**.

> 💡 **La règle qui doit figurer dans la procédure** : *en cas de doute, on notifie.* L'article 30 autorise la notification volontaire ; le coût d'une notification de trop est nul, celui d'une notification manquante est un manquement à l'article 23.

---

7. Les décisions difficiles, et comment elles ont été tranchées

Décision	Prise à	Par	Motif	Difficulté
Couper le lien IT ↔ OT	04 h 30	RSSI + exploitation	Suspicion de propagation	Perte de la télégestion — assumée : **la sûreté prime**
Notifier avant d'avoir tout compris	08 h 00	DG sur proposition du RSSI	Art. 23(4)(a) n'exige pas de comprendre	Réticence naturelle à « déclarer sans savoir »
Ne pas payer la rançon	09 h 00	DG	Décision de principe actée **avant** la crise	Pression du délai de reconstruction
Reconstruire sur socle neuf plutôt que restaurer en place	17/03	DSI + CERT-FR	Le socle existant est suspect	Rallonge le délai de 3 jours
Communiquer publiquement dès J0	15 h 00	DG + communication	Les usagers constatent déjà les pannes	Crainte de l'effet médiatique
Ne pas reconnecter l'OT avant vérification d'intégrité	22/03	Exploitation	Risque de réinfection	6 jours en mode dégradé, charge humaine importante

> 🔑 **Toutes ces décisions étaient tranchées à l'avance**, par écrit, dans la procédure validée en COSSI. En crise, on n'invente pas : on applique ce qu'on a décidé au calme.

---

8. Ce qui a bien fonctionné, et ce qui a manqué

✅ Ce qui a sauvé la situation

Élément	Mesure	Origine
La coupure du lien IT/OT en 33 minutes	Procédure écrite et testée	Art. 21(2)(c)
La sauvegarde hors ligne intacte	Bande sortie du robot chaque vendredi	Action **A-06** (phase 0)
Les programmes automates versionnés	Dépôt Git hors domaine	Action **A-07** (phase 0)
Les modèles de notification prêts	Rédigés au calme, disponibles sur papier	Action **A-04** (phase 0)
La messagerie hors domaine	Comptes créés et testés à froid	Action **A-09** (phase 0)
Le MFA sur les comptes d'administration	A limité la propagation	Action **A-05** (phase 0)
L'autonomie locale des automates	Régulation maintenue sans SCADA	Conception historique

> 🎯 **Six des sept éléments proviennent de la phase 0 du plan** — celle qui coûte 95 k€ sur un budget total de 956 k€. C'est l'argument le plus fort de la feuille de route.

❌ Ce qui a manqué

Manque	Conséquence	Action corrective	Écart
Réseau non segmenté	La coupure a dû être **physique et brutale**, avec perte totale de la télégestion pendant 6 jours. Avec la segmentation, l'isolement aurait été logique, immédiat et partiel	Accélérer la phase 2	E-01
Journalisation insuffisante	9 jours pour identifier le point d'entrée ; certains journaux avaient tourné	Journalisation centralisée 12 mois	E-13
Horloges désynchronisées	20 minutes d'écart entre équipements : la chronologie a dû être reconstruite manuellement	NTP généralisé	E-13
Inventaire OT incomplet	3 automates découverts pendant la vérification d'intégrité, non répertoriés	Inventaire exhaustif	E-08
Compte prestataire trop privilégié	Le vecteur initial disposait de droits d'administration du domaine	Moindre privilège, comptes séparés	E-09
Pas de détection OT	Impossible de prouver l'absence de compromission autrement que par audit manuel	Sonde passive	E-14

Le plan d'amélioration issu du retour d'expérience

#	Action	Responsable	Échéance
REX-1	Avancer de 3 mois le jalon de segmentation (A-22 à A-27)	DSI	Décision COSSI du 20/04
REX-2	Déployer le NTP sur l'intégralité du parc **sans attendre** le reste du projet de journalisation	DSI	30/05/2027
REX-3	Revue immédiate des comptes prestataires à privilèges	DSI	30/04/2027
REX-4	Ajouter au scénario d'exercice une variante « le RSSI est indisponible »	RSSI	Exercice 2028
REX-5	Formaliser la relève : nul ne reste en cellule plus de 12 h	DG	30/05/2027
REX-6	Doubler la fréquence des tests de restauration (trimestriel → mensuel)	DSI	30/04/2027

---

9. Ce que la segmentation aurait changé

Moment	Sans segmentation (réel)	Avec segmentation (cible mars 2028)
04 h 12	Propagation possible vers l'OT à tout instant	⛔ Bloquée par la règle **D-01** dès le départ
04 h 30	Décision de couper physiquement	Isolement **logique** en une commande, ou déjà effectif
04 h 45	**Perte totale de la télégestion** pendant 6 jours	Télégestion **conservée** : seuls les flux IT ↔ DMZ sont coupés
06 h 15	Sauvegardes sauvées grâce à la bande hors ligne	Sauvegardes **également protégées par D-06**
22/03	Vérification manuelle de 350 automates, 4 jours	Sonde passive + inventaire de référence : quelques heures
Coût	Astreinte renforcée 6 jours, ≈ 45 k€ 🟥 + facturation décalée	Réduit de l'ordre de 80 %

> 🎯 **La conclusion à présenter au COSSI** : *l'incident a été survécu grâce à la phase 0. Il aurait été contenu grâce à la phase 2. La segmentation ne se justifie pas par la conformité, elle se justifie par les six jours de télégestion perdus.*

---

10. Le mémo de crise (à afficher en salle de crise)

```
+-------------------------------------------------------------+
|  INCIDENT CYBER - LES 8 PREMIERS REFLEXES                   |
+-------------------------------------------------------------+
| 1. NOTER L'HEURE. C'est T0. Ouvrir la main courante.        |
| 2. NE PAS ETEINDRE les machines touchees (preuves en memoire).|
| 3. ISOLER : couper le lien IT/OT AVANT toute analyse.       |
| 4. VERIFIER que l'eau coule : mode degrade, astreinte.      |
| 5. APPELER : DSI -> RSSI -> DG. Puis le CERT-FR.            |
| 6. QUALIFIER avec la grille. En cas de doute : ON NOTIFIE.  |
| 7. NOTIFIER : alerte precoce sous 24 h, meme incomplete.    |
| 8. NE PAS REINSTALLER avant d'avoir fait les images disque. |
+-------------------------------------------------------------+
|  DELAIS : 24 h alerte | 72 h notification |                 |
|           1 MOIS rapport final A COMPTER DE LA NOTIF 72 H   |
|  RGPD : 72 h a la CNIL si donnees personnelles (delai propre) |
+-------------------------------------------------------------+
|  CONTACTS (annuaire papier - salle de crise)                |
|  CERT-FR ........ voir fiche contacts                       |
|  Autorite NIS2 .. MonEspaceNIS2 + courriel de secours       |
|  CNIL ........... teleservice de notification               |
|  Assureur cyber . police n° .....                           |
|  Prefecture / ARS ..... voir fiche contacts                 |
+-------------------------------------------------------------+
```

---

11. Conclusion

Le scénario montre trois choses :

1. **Les délais de l'article 23 sont tenables** — à condition d'avoir écrit la procédure **avant**. L'alerte précoce a été envoyée à T0 + 10 h, la notification à T0 + 61 h, le rapport final 28 jours après la notification. Les trois échéances ont été respectées avec de la marge.
2. **La continuité du service d'eau ne dépend pas de l'informatique** — les automates ont régulé seuls pendant six jours. C'est une **propriété de conception**, à exiger contractuellement et à tester chaque année.
3. **Les mesures les moins chères sont celles qui ont sauvé la situation.** Six des sept facteurs décisifs proviennent de la phase 0 du plan, soit 95 k€ sur 956 k€.

📗 L'article 21(4) impose de corriger sans délai les manquements constatés : le retour d'expérience produit six actions correctives datées, présentées au COSSI le 20 avril 2027.

ANNEXE A

Annexe A — Alerte précoce (24 h)

> 📗 **Fondement** : article 23(4)(a) de la directive (UE) 2022/2555 **Délai** : sans retard injustifié et **en tout état de cause dans les 24 heures** après avoir eu connaissance de l'incident important. **Contenu minimal exigé** : indiquer si l'incident est **susceptible d'avoir été causé par des actes illicites ou malveillants** et s'il peut avoir un **impact transfrontalier**.

⚠️ Mode d'emploi

- Ce document est **un modèle rempli** avec les données du scénario du bloc 4. Les champs entre `<...>` sont à compléter le jour J.
- 📕 Le **format exact** sera imposé par la plateforme nationale (MonEspaceNIS2) et par les actes d'exécution prévus à l'article 23(11). Ce modèle en couvre le contenu ; il sert aussi de **brouillon de travail** quand la plateforme est inaccessible.
- 🔴 **Ne jamais retarder l'envoi pour compléter une information manquante.** Écrire « non déterminé à ce stade » est parfaitement recevable : l'article 23(4)(a) demande un signalement, pas une analyse.
- L'alerte se **prépare à froid** et se conserve **sur papier** : le jour J, l'intranet peut être chiffré.

ALERTE PRÉCOCE — INCIDENT DE CYBERSÉCURITÉ

Fondement juridique : article 23(4)(a) de la directive (UE) 2022/2555 **Destinataire** : autorité nationale compétente / CSIRT national **Émetteur** : HydroRégie — entité essentielle (annexe I, point 6 — eau potable) **Référence interne** : `INC-2027-0316-001` **Date et heure d'envoi** : **mardi 16 mars 2027, 14 h 30 Délai écoulé depuis la connaissance de l'incident** : **10 h 18** ✅

---

1. Identification de l'entité

Champ	Valeur
Raison sociale	HydroRégie
Statut NIS2	**Entité essentielle** — art. 3(1)(a)
Secteur	**Annexe I, point 6 — Eau potable**
Identifiant d'enregistrement	`<n° MonEspaceNIS2>`
Adresse	`<adresse du siège>`
Population desservie	450 000 habitants — 240 000 abonnés — 62 communes
Référent NIS2	`<nom, fonction>`
Téléphone d'astreinte 24/7	`<n°>`
Adresse électronique de crise	`<adresse hors domaine>`

> ⚠️ **Les coordonnées transmises doivent être celles de l'astreinte**, pas celles d'un standard. Elles servent au retour de l'autorité prévu à l'article 23(5), sous 24 h.

2. Date et heure de l'incident

Champ	Valeur
Date et heure de connaissance de l'incident (T0)	**16/03/2027 à 04 h 12**
Source de la détection	Astreinte exploitation — alarmes SCADA multiples et indisponibilité des postes bureautiques
Date et heure de début estimée de l'incident	Non déterminée à ce stade — investigations en cours
Incident **toujours en cours** ?	✅ **Oui**

3. Nature de l'incident

Description succincte :

> Chiffrement par rançongiciel d'une partie du système d'information de gestion d'HydroRégie, détecté le 16 mars 2027 à 04 h 12. Sont touchés : l'annuaire Active Directory, les serveurs de fichiers, l'application de facturation des abonnés, la gestion de maintenance et la messagerie.
>
> Le système industriel (supervision et automates de production et de distribution d'eau) **n'est pas affecté à ce stade**. Par précaution, la liaison entre le système d'information de gestion et le système industriel a été **physiquement coupée à 04 h 45**, soit 33 minutes après la détection.
>
> **La production et la distribution d'eau potable ne sont pas interrompues.** Les installations fonctionnent en mode dégradé autonome : les automates assurent la régulation locale sans supervision centralisée.

4. 📗 Actes illicites ou malveillants *(mention exigée par l'art. 23(4)(a))*

> ✅ **OUI** — l'incident est **susceptible d'avoir été causé par des actes illicites ou malveillants**. Un rançongiciel avec demande de rançon a été identifié sur au moins deux serveurs. Un dépôt de plainte est en cours de préparation.

5. 📗 Impact transfrontalier *(mention exigée par l'art. 23(4)(a))*

> ❌ **NON** — aucun impact transfrontalier identifié à ce stade. HydroRégie exerce son activité exclusivement sur le territoire national et ne fournit aucun service dans un autre État membre.

6. Impact constaté à ce stade

Domaine	État
Production et distribution d'eau potable	✅ **Non interrompue** — mode dégradé autonome
Qualité de l'eau	✅ Non affectée — contrôles renforcés par prélèvements en cours
Supervision centralisée (SCADA)	⚠️ Volontairement isolée
Facturation et espace abonnés	❌ Indisponibles
Accueil téléphonique et messagerie	❌ Indisponibles
Gestion de maintenance (GMAO)	❌ Indisponible
Données à caractère personnel	⚠️ **Potentiellement concernées** — 240 000 abonnés. Notification à l'autorité de protection des données en préparation
Nombre d'usagers concernés	450 000 habitants (service), 240 000 abonnés (données)

7. Mesures déjà prises

1. Coupure physique de la liaison entre le système de gestion et le système industriel (04 h 45)
2. Isolement du système d'information : coupure de l'accès Internet, arrêt des serveurs sains
3. Vérification des sauvegardes hors ligne — **intactes**, restauration possible
4. Activation de la cellule de crise (05 h 30) et de l'astreinte renforcée sur les sites sensibles
5. Bascule en exploitation dégradée autonome, avec rondes et prélèvements renforcés
6. Réalisation d'images disque des serveurs touchés avant toute réinstallation (préservation des preuves)
7. Prise de contact avec le CSIRT national pour assistance technique
8. Information des usagers par les canaux publics (art. 23(1))

8. Assistance souhaitée

> Une assistance technique est **sollicitée** au titre de l'article 23(5), en particulier sur : l'identification de la souche et des indicateurs de compromission à rechercher, la vérification de l'absence de compromission du système industriel, et les précautions de reconstruction.

9. Suite prévue

> Une **notification d'incident** au titre de l'article 23(4)(b) sera transmise **dans les 72 heures suivant la connaissance de l'incident**, soit au plus tard le **19/03/2027 à 04 h 12**, avec une évaluation initiale de la gravité, de l'impact et, lorsqu'ils seront disponibles, les indicateurs de compromission.

Rédigé par : `<nom>`, RSSI **Validé par** : `<nom>`, Directeur général **Transmis le** : 16/03/2027 à 14 h 30 · **Accusé de réception** : `AR-2027-0316-1430`

📋 Aide-mémoire de rédaction

✅ À faire	❌ À éviter
Envoyer **même si tout n'est pas su**	Attendre de « tout comprendre »
Écrire « non déterminé à ce stade »	Laisser un champ vide, ou inventer
Donner l'heure **exacte** de T0	Arrondir ou reculer T0
Répondre explicitement aux **deux mentions exigées** (actes malveillants, transfrontalier)	Les oublier — ce sont les seules obligations de contenu de l'art. 23(4)(a)
Indiquer si le service essentiel est affecté	Se limiter au volet informatique
Faire **valider par la direction** avant envoi	Envoyer sans validation (art. 20(1))
Conserver l'accusé de réception	Ne garder aucune preuve d'envoi

---

ANNEXE B

Annexe B — Notification d'incident (72 h)

> 📗 **Fondement** : article 23(4)(b) de la directive (UE) 2022/2555 **Délai** : sans retard injustifié et **dans les 72 heures** après avoir eu connaissance de l'incident important. **Contenu exigé** : mettre à jour l'alerte précoce, fournir une **évaluation initiale** de l'incident (gravité, impact) et, **lorsqu'ils sont disponibles**, les **indicateurs de compromission**.

NOTIFICATION D'INCIDENT

Fondement juridique : article 23(4)(b) de la directive (UE) 2022/2555 **Destinataire** : autorité nationale compétente / CSIRT national **Émetteur** : HydroRégie — entité essentielle (annexe I, point 6) **Référence interne** : `INC-2027-0316-001` — **mise à jour n° 1 Se rapporte à** : alerte précoce du 16/03/2027 à 14 h 30 (accusé `AR-2027-0316-1430`) **Date et heure d'envoi** : **jeudi 18 mars 2027, 17 h 00 Délai écoulé depuis T0** : **60 h 48** ✅ *(échéance : 19/03/2027 à 04 h 12)*

---

1. Rappel des éléments de l'alerte précoce

Champ	Valeur	Évolution
T0 — connaissance de l'incident	16/03/2027 à 04 h 12	Inchangé
Type	Rançongiciel sur le système d'information de gestion	Confirmé
Actes illicites ou malveillants	Oui	**Confirmé** — plainte déposée le 17/03/2027
Impact transfrontalier	Non	Confirmé
Incident en cours	Oui	⚠️ **Toujours en cours** — reconstruction engagée

2. Évaluation initiale de la gravité

Critère	Évaluation
Perturbation opérationnelle	**Grave** sur le système de gestion : facturation, relation abonnés, maintenance et messagerie indisponibles depuis 3 jours
Continuité du service essentiel	✅ **Maintenue** — distribution d'eau potable non interrompue, aucun usager privé d'eau
Qualité de l'eau	✅ Conforme — 46 prélèvements réalisés depuis le 16/03, tous conformes
Système industriel	✅ **Non compromis** — vérification d'intégrité en cours, aucune modification de programme ou de consigne détectée à ce jour
Données à caractère personnel	⚠️ **Affectées** — 240 000 abonnés (identité, adresse, coordonnées bancaires de prélèvement, historique de consommation). Notification à l'autorité de protection des données transmise le 18/03/2027
Pertes financières estimées	📕 Entre 800 k€ et 1,4 M€ (remédiation, astreinte renforcée, décalage de facturation) — estimation provisoire
Nombre de personnes concernées	450 000 habitants (service), 240 000 abonnés (données)
Durée d'indisponibilité	3 jours à ce jour ; rétablissement complet estimé au 26/03/2027

> 📗 **Qualification retenue au titre de l'art. 23(3)** : incident important au titre du critère (a) — perturbation opérationnelle grave et pertes financières — **et** du critère (b) — dommages susceptibles d'affecter des tiers (abonnés).

3. Description technique de l'incident

3.1 Chronologie établie à ce stade

Date / heure	Événement
07/03/2027 ~23 h 41	**Première connexion** frauduleuse identifiée, via le compte d'un prestataire de maintenance bureautique
07/03 → 15/03	Phase de reconnaissance et de latéralisation (9 jours) — élévation de privilèges sur le domaine
15/03/2027 ~22 h 00	Suppression des copies d'ombre (*shadow copies*) et préparation du chiffrement
16/03/2027 ~03 h 50	**Déclenchement du chiffrement**
16/03/2027 04 h 12	🔴 **T0 — détection** par l'astreinte exploitation
16/03/2027 04 h 45	Coupure physique de la liaison gestion ↔ industriel
16/03/2027 06 h 15	Sauvegardes hors ligne vérifiées intactes
17/03/2027	Point d'entrée identifié ; début de la reconstruction sur socle sain
18/03/2027	Restauration de l'annuaire en cours ; vérification d'intégrité du système industriel engagée

3.2 Vecteur initial

> Compromission du compte d'un **prestataire de maintenance bureautique**, à la suite d'un hameçonnage ciblé. Ce compte disposait de **droits d'administration du domaine**, ce qui a permis une latéralisation rapide. L'accès n'était **pas protégé par une authentification multifacteur** à la date de la compromission — la généralisation du MFA aux comptes de prestataires était planifiée pour le 30 juin 2027 dans notre feuille de route de mise en conformité.

3.3 Systèmes affectés

Système	État	Restauration
Contrôleurs de domaine (2)	Chiffrés	Reconstruction sur socle neuf, en cours
Serveurs de fichiers (3)	Chiffrés	Restauration depuis bande du 12/03
Application de facturation	Chiffrée	Restauration prévue le 20/03
Gestion de maintenance (GMAO)	Chiffrée	Restauration prévue le 22/03
Messagerie	Indisponible	Rétablissement prévu le 26/03
Postes de travail (≈ 180 sur 420)	Chiffrés	Réinstallation par lots
Superviseur SCADA	✅ **Sain**	Isolé volontairement
Automates et RTU (≈ 350)	✅ **Sains**	Vérification d'intégrité en cours
Historian	✅ Sain	—

3.4 📗 Indicateurs de compromission *(art. 23(4)(b) — « lorsqu'ils sont disponibles »)*

Type	Valeur	Commentaire
Famille de rançongiciel	`<famille identifiée avec l'appui du CSIRT>`	Identifiée le 16/03 à 22 h 00
Empreintes des exécutables	`<SHA-256 des binaires>`	Extraits des images disque
Adresses IP de commande et contrôle	`<adresses>`	Bloquées en périmétrie
Comptes compromis	`<identifiants>`	Désactivés, mots de passe réinitialisés
Extension des fichiers chiffrés	`<extension>`	—
Nom de la note de rançon	`<nom du fichier>`	—
Persistance observée	Tâches planifiées + service Windows	Supprimées
Outils légitimes détournés	Outils d'administration à distance et d'archivage	—

> 💡 Les indicateurs sont transmis **au format demandé par le CSIRT** et partagés au titre de l'article 29 (partage d'informations) afin d'aider les autres opérateurs du secteur.

4. Mesures d'atténuation appliquées

#	Mesure	Date	Effet
1	Coupure gestion ↔ industriel	16/03 04 h 45	🔴 **A empêché toute propagation vers le procédé**
2	Isolement du système d'information	16/03 06 h 00	Arrêt de la propagation interne
3	Mise hors ligne des sauvegardes restantes	16/03 06 h 15	Préservation de la capacité de reprise
4	Blocage des adresses de commande et contrôle	16/03 20 h 00	Coupure du canal de pilotage
5	Réinitialisation de l'ensemble des mots de passe	17/03	Révocation des accès de l'attaquant
6	Désactivation des comptes prestataires	16/03 08 h 00	Fermeture du vecteur initial
7	Reconstruction sur socle sain	17/03 →	Évite la réinfection
8	Exploitation en mode dégradé autonome	16/03 04 h 45 →	✅ **Continuité de la distribution d'eau**
9	Contrôles qualité renforcés (prélèvements toutes les 4 h)	16/03 →	Sécurité sanitaire

5. Mesures en cours

- Vérification d'intégrité de l'ensemble des automates et du superviseur, par l'intégrateur
- Reconstruction de l'annuaire et restauration des applications métier
- Recherche des indicateurs de compromission sur l'ensemble du parc
- Analyse des journaux disponibles pour préciser le périmètre de l'exfiltration éventuelle

6. Impact transfrontalier

> ❌ Aucun. Activité exclusivement nationale, aucun service fourni dans un autre État membre, aucune interconnexion avec un opérateur étranger.

7. Information des tiers

Destinataire	Fondement	Date
Usagers et abonnés	**Art. 23(1)** — incident affectant la fourniture des services	16/03 à 15 h 00, puis mises à jour quotidiennes
Autorité de protection des données (CNIL)	Art. 33 RGPD	18/03 à 17 h 30
Autorité organisatrice, préfecture, agence régionale de santé	Obligations sectorielles	16/03 à 10 h 00
Dépôt de plainte	—	17/03
Assureur	Contrat	16/03

8. Suite prévue

> Un **rapport final** sera transmis au titre de l'article 23(4)(d), **au plus tard un mois après la présente notification**, soit le **18 avril 2027**. Il comprendra la description détaillée de l'incident, le type de menace et la cause profonde, les mesures d'atténuation appliquées et en cours, et l'absence d'impact transfrontalier.
>
> Si l'incident était encore en cours à cette date, un **rapport d'avancement** serait transmis au titre de l'article 23(4)(e), suivi du rapport final dans le mois suivant le traitement de l'incident.

Rédigé par : `<nom>`, RSSI · **Validé par** : `<nom>`, Directeur général **Transmis le** : 18/03/2027 à 17 h 00 · **Accusé de réception** : `AR-2027-0318-1700`

📋 Aide-mémoire de rédaction

✅ À faire	❌ À éviter
Mettre à jour l'alerte précoce, ne pas la réécrire de zéro	Repartir d'une page blanche
Donner une **évaluation initiale** — c'est le mot du texte, une estimation suffit	Attendre des chiffres définitifs
Fournir les indicateurs **disponibles**	Retarder l'envoi pour attendre l'analyse complète
Dire clairement si le **service essentiel** est maintenu	Ne parler que du système d'information
Assumer les écarts (ici : MFA prestataires non encore déployé)	Masquer une faiblesse — l'autorité la découvrira, et la transparence est un facteur d'atténuation (art. 32(7))
Annoncer l'échéance du rapport final	Laisser la suite dans le flou

ANNEXE C

Annexe C — Rapport final (1 mois)

> 📗 **Fondement** : article 23(4)(d) de la directive (UE) 2022/2555 **Délai** : au plus tard **un mois après la transmission de la notification d'incident** (celle des 72 h) — 🔴 **pas** un mois après la découverte. **Contenu exigé** : (i) description détaillée de l'incident, y compris sa gravité et son impact ; (ii) type de menace ou **cause profonde** ayant probablement déclenché l'incident ; (iii) mesures d'atténuation **appliquées et en cours** ; (iv) le cas échéant, **impact transfrontalier**.

RAPPORT FINAL D'INCIDENT

Fondement juridique : article 23(4)(d) de la directive (UE) 2022/2555 **Destinataire** : autorité nationale compétente / CSIRT national **Émetteur** : HydroRégie — entité essentielle (annexe I, point 6) **Référence interne** : `INC-2027-0316-001` — **rapport final Se rapporte à** : alerte précoce du 16/03/2027 et notification d'incident du 18/03/2027 **Date d'envoi** : **jeudi 15 avril 2027 Délai** : **28 jours** après la notification du 18/03 ✅ *(échéance : 18/04/2027)* **État de l'incident** : ✅ **Clos** — service intégralement rétabli le 26/03/2027

---

1. Synthèse

Élément	Valeur
Type d'incident	Rançongiciel avec double extorsion (chiffrement + menace de divulgation)
Date de compromission initiale	07/03/2027 vers 23 h 41
Date de détection (T0)	16/03/2027 à 04 h 12
Durée de présence non détectée	**9 jours**
Date de rétablissement complet	26/03/2027
Interruption de la distribution d'eau	✅ **AUCUNE**
Durée d'exploitation en mode dégradé	6 jours (16/03 au 22/03)
Systèmes de gestion touchés	2 contrôleurs de domaine, 3 serveurs de fichiers, 3 applications métier, 180 postes
Système industriel	✅ **Non compromis** — vérification exhaustive des 350 automates
Personnes concernées	240 000 abonnés (données), 450 000 habitants (service)
Rançon	❌ **Non payée**
Coût total constaté 📕	**1,18 M€**

---

2. 📗 (i) Description détaillée de l'incident, gravité et impact

2.1 Déroulement complet

Phase	Période	Description
Compromission initiale	07/03 23 h 41	Connexion frauduleuse au VPN avec les identifiants d'un prestataire de maintenance bureautique, obtenus par hameçonnage ciblé (courriel imitant un portail de gestion de tickets). Le compte disposait de droits d'administration du domaine et n'était pas protégé par une authentification multifacteur
Reconnaissance	08/03 → 12/03	Cartographie du réseau, identification des serveurs de fichiers, de l'annuaire et des sauvegardes. Utilisation d'outils d'administration légitimes (technique dite du « détournement d'outils intégrés »)
Exfiltration	12/03 → 14/03	Extraction d'environ **42 Go** de données depuis les serveurs de fichiers, dont des exports de la base abonnés
Préparation	15/03 22 h 00	Suppression des copies d'ombre, désactivation de l'antivirus par stratégie de groupe, déploiement de la charge utile
Chiffrement	16/03 03 h 50	Déclenchement simultané sur l'ensemble du domaine
Détection	16/03 04 h 12	Alarmes SCADA (perte de liaison avec l'historian) et indisponibilité des postes du siège
Confinement	16/03 04 h 45	Coupure physique gestion ↔ industriel — **33 minutes après la détection**
Remédiation	17/03 → 26/03	Reconstruction sur socle sain, restauration, vérifications
Retour au mode nominal	23/03	Reconnexion progressive du lien gestion ↔ industriel après vérification d'intégrité

2.2 Gravité

Critère de l'art. 23(3)	Évaluation finale
(a) Perturbation opérationnelle grave	✅ Confirmée sur le système de gestion — 10 jours d'indisponibilité partielle
(a) Pertes financières	✅ Confirmées — **1,18 M€**
(b) Dommages à des tiers	✅ Confirmés — exfiltration de données de 240 000 abonnés, dont des coordonnées bancaires de prélèvement
Continuité du service essentiel	✅ **Maintenue** — aucun usager privé d'eau, aucune non-conformité de qualité

2.3 Impact détaillé

Domaine	Impact	Durée
Distribution d'eau potable	✅ **Aucune interruption**	—
Qualité de l'eau	✅ Aucune non-conformité — 312 prélèvements réalisés, tous conformes	—
Supervision centralisée	Indisponible (isolement volontaire)	6 jours
Facturation abonnés	Indisponible	10 jours — 2 cycles de facturation décalés
Espace abonnés en ligne	Indisponible	10 jours
Accueil téléphonique	Dégradé	8 jours
Gestion de maintenance	Indisponible	6 jours — 87 interventions reportées
Messagerie	Indisponible	10 jours
Données personnelles	240 000 abonnés — exfiltration confirmée	Permanent
Charge humaine	Astreinte renforcée : **1 240 heures** supplémentaires	6 jours

2.4 Coût constaté 📕

Poste	Montant
Prestation de réponse à incident et investigation	185 k€
Reconstruction (matériel, licences, main-d'œuvre)	310 k€
Astreinte renforcée et heures supplémentaires	95 k€
Perte et décalage de recettes de facturation	420 k€
Communication de crise et information des abonnés	45 k€
Accompagnement juridique et notification RGPD	65 k€
Mesures correctives immédiates	60 k€
TOTAL	**1 180 k€**

> 💡 À comparer aux **956 k€** du plan complet de mise en conformité sur 24 mois. **Un seul incident a coûté plus cher que la totalité du plan.**

---

3. 📗 (ii) Type de menace et cause profonde

3.1 Type de menace

> Rançongiciel opéré par un groupe criminel, selon un mode opératoire dit de **double extorsion** : exfiltration des données **puis** chiffrement, avec menace de divulgation publique. Motivation financière ; aucune indication d'un ciblage lié à la nature de service essentiel de l'entité.

3.2 🔴 Cause profonde

L'analyse identifie **une cause immédiate** et **quatre causes structurelles**.

#	Cause	Nature	Écart correspondant
C1	**Compte de prestataire disposant de droits d'administration du domaine, sans authentification multifacteur**	🔴 **Cause immédiate**	E-05, E-09
C2	**Absence de segmentation entre le système de gestion et le système industriel** — la propagation vers l'OT n'a été empêchée que par une intervention humaine en 33 minutes	Structurelle	E-01
C3	**Journalisation insuffisante** — 9 jours de présence non détectée ; certains journaux avaient déjà tourné lors de l'investigation	Structurelle	E-13
C4	**Absence d'exigences de sécurité contractuelles** vis-à-vis des prestataires	Structurelle	E-11
C5	**Absence de détection comportementale** — la latéralisation et la suppression des copies d'ombre n'ont déclenché aucune alerte	Structurelle	E-13, E-14

> 📗 Ces causes étaient **déjà identifiées** dans l'analyse d'écart du 10 septembre 2026 et inscrites au plan d'actions approuvé par la direction. L'incident est survenu pendant la phase de mise en œuvre du plan. Les mesures de la **phase 0** (sauvegardes hors ligne, procédure de notification, MFA sur les comptes d'administration, communication hors domaine), **déjà déployées**, ont permis de limiter l'impact et de restaurer sans payer de rançon.

---

4. 📗 (iii) Mesures d'atténuation appliquées et en cours

4.1 Mesures appliquées pendant l'incident

#	Mesure	Date	Effet mesuré
1	Coupure physique gestion ↔ industriel	16/03 04 h 45	🔴 **Propagation vers le procédé empêchée**
2	Isolement complet du système d'information	16/03 06 h 00	Arrêt de la propagation
3	Bascule en exploitation dégradée autonome	16/03 04 h 45	✅ **Continuité de la distribution**
4	Restauration depuis sauvegarde hors ligne du 12/03	19/03 → 22/03	**Rançon non payée**
5	Reconstruction sur socle sain	17/03 → 26/03	Aucune réinfection constatée
6	Réinitialisation générale des accès	17/03	Révocation des accès de l'attaquant
7	Vérification d'intégrité des 350 automates	17/03 → 22/03	✅ Aucune modification détectée
8	Contrôles qualité renforcés	16/03 → 26/03	312 prélèvements conformes

4.2 Mesures correctives déjà mises en œuvre depuis l'incident

#	Mesure	Date	Écart clos
1	**MFA généralisé à tous les comptes prestataires et à privilèges**	30/03/2027	E-05 (avancé de 3 mois)
2	**Suppression de tous les droits d'administration du domaine accordés à des prestataires**	28/03/2027	E-09
3	Comptes prestataires **désactivés par défaut**, activation sur ticket avec expiration automatique	05/04/2027	E-03
4	**Synchronisation horaire (NTP) déployée sur l'ensemble du parc**	10/04/2027	E-13 (partiel)
5	Passage des tests de restauration en cadence mensuelle	01/04/2027	E-04
6	Deuxième copie hors ligne, sur un site distinct	12/04/2027	E-04

4.3 Mesures en cours

#	Mesure	Échéance	Écart
1	🔴 **Segmentation IT / OT** — projet accéléré de 3 mois par décision du comité de sécurité du 20/04/2027	**31/12/2027** au lieu du 31/03/2028	E-01
2	Journalisation centralisée avec rétention de 12 mois	31/12/2027	E-13
3	Détection comportementale sur le système de gestion	30/09/2027	E-13
4	Sonde passive de détection sur le réseau industriel	31/01/2028	E-14
5	Annexe sécurité contractuelle imposée à tous les prestataires	30/06/2027	E-11
6	Campagne de sensibilisation renforcée, incluant les prestataires	30/06/2027	E-12
7	Test d'intrusion externe	30/09/2027	E-17

---

5. 📗 (iv) Impact transfrontalier

> ❌ **Aucun impact transfrontalier.** HydroRégie exerce son activité exclusivement sur le territoire national, ne fournit aucun service dans un autre État membre et n'a aucune interconnexion opérationnelle avec un opérateur étranger. Aucun autre État membre n'a été affecté.

---

6. Enseignements et partage

6.1 Ce qui a fonctionné

1. La **procédure de coupure gestion ↔ industriel**, écrite et testée, appliquée en 33 minutes.
2. La **sauvegarde hors ligne**, déployée trois mois plus tôt : elle a rendu la rançon inutile.
3. Les **modèles de notification** préparés à froid : les trois échéances ont été tenues avec marge.
4. L'**autonomie locale des automates** : six jours d'exploitation sans supervision, sans coupure d'eau.
5. La **communication hors domaine** : la cellule de crise a pu se coordonner malgré la perte de la messagerie.

6.2 Ce qui doit changer

1. La **segmentation** ne peut plus attendre : elle transforme une coupure physique brutale en isolement logique maîtrisé.

2. La **journalisation** est le prérequis de la détection : 9 jours de présence non détectée sont inacceptables pour une entité essentielle.
3. Les **prestataires** doivent être traités comme une extension du périmètre, avec les mêmes exigences (art. 21(2)(d) et 21(3)).

6.3 Partage d'informations

> Conformément à l'esprit de l'article 29, HydroRégie a partagé les **indicateurs de compromission** et le **retour d'expérience anonymisé** avec le CSIRT national et la communauté sectorielle des exploitants d'eau, afin de permettre à d'autres opérateurs de rechercher les mêmes traces.

Rédigé par : `<nom>`, RSSI · **Validé par** : `<nom>`, Directeur général **Approuvé par le comité de sécurité des systèmes d'information** le 20/04/2027 (art. 20(1)) **Transmis le** : 15/04/2027 · **Accusé de réception** : `AR-2027-0415-XXXX`

📋 Aide-mémoire de rédaction

✅ À faire	❌ À éviter
Traiter **explicitement les quatre points** (i) à (iv) de l'art. 23(4)(d)	Rédiger un récit libre sans structure
Compter le mois **depuis la notification des 72 h**	Compter depuis la découverte
Nommer la **cause profonde**, pas seulement la cause immédiate	S'arrêter à « un utilisateur a cliqué »
Distinguer les mesures **appliquées** et **en cours**	Présenter comme fait ce qui est planifié
Chiffrer l'impact réel	Rester dans le qualitatif
Assumer les écarts connus avant l'incident	Prétendre que rien n'était identifié — le plan d'actions daté prouve le contraire, et **c'est un atout** (art. 32(7) : degré de coopération et mesures prises)
Si l'incident est encore en cours : envoyer un **rapport d'avancement** (art. 23(4)(e))	Laisser passer l'échéance

---

ANNEXE D

Annexe D — Information des usagers

> 📗 **Fondement** : article 23(1) de la directive (UE) 2022/2555 — l'entité notifie **sans retard injustifié aux destinataires de ses services** les incidents importants susceptibles de nuire à la fourniture de ces services. L'article 23(2) ajoute l'information en cas de **cybermenace importante**. ⚠️ À ne pas confondre avec l'article 34 du RGPD (communication d'une violation aux personnes concernées quand le risque est élevé) — voir annexe E.

---

1. Message n° 1 — Publié le 16/03/2027 à 15 h 00 (J0)

Site institutionnel, réseaux sociaux, message d'accueil téléphonique

---

> ### 💧 L'eau est distribuée normalement — nos services en ligne sont perturbés
>
> **Mardi 16 mars 2027 — 15 h 00**
>
> HydroRégie est touchée depuis cette nuit par une **cyberattaque** visant son système informatique de gestion.
>
> **Ce qui n'est pas affecté :** - ✅ **La production et la distribution d'eau potable fonctionnent normalement.** Aucune coupure n'est à prévoir. - ✅ **La qualité de l'eau n'est pas affectée.** Nos contrôles sanitaires sont renforcés et tous les prélèvements réalisés depuis cette nuit sont conformes.
>
> **Ce qui est perturbé :** - ❌ Votre espace abonné en ligne est **indisponible** - ❌ Notre accueil téléphonique fonctionne en mode réduit - ❌ Les échanges par courriel sont **interrompus** - ⏸️ L'émission des factures est **suspendue** — aucun retard ne vous sera imputé
>
> **Ce que vous devez faire :** - **Rien pour l'instant.** Vos prélèvements automatiques en cours ne sont pas affectés. - ⚠️ **Soyez vigilants** : nous ne vous demanderons **jamais** vos coordonnées bancaires par téléphone, courriel ou SMS. En cas de doute, ne répondez pas. - 🚨 **En cas d'urgence sur le réseau d'eau** (fuite, absence d'eau, eau colorée), appelez le `<numéro d'astreinte>`, qui reste joignable 24 h/24.
>
> Nous avons immédiatement isolé nos installations industrielles par précaution et informé les autorités compétentes. Une enquête est en cours.
>
> Nous publierons une mise à jour **chaque jour à 12 h** jusqu'au rétablissement.
>
> *La direction d'HydroRégie*

---

2. Message n° 2 — Publié le 19/03/2027 (J+3)

Après confirmation de l'exfiltration de données

> ### 💧 Point de situation — des données d'abonnés ont été dérobées
>
> **Vendredi 19 mars 2027 — 12 h 00**
>
> **L'eau continue d'être distribuée normalement et sa qualité reste conforme.** 312 prélèvements ont été réalisés depuis mardi : tous sont conformes.
>
> **Nouvelle information importante**
>
> Nos investigations ont confirmé que les auteurs de l'attaque ont **dérobé des données** concernant nos abonnés avant de chiffrer nos systèmes. Sont potentiellement concernés :
>
> - votre nom, votre adresse postale et vos coordonnées ; - vos coordonnées bancaires utilisées pour le prélèvement (IBAN) ; - votre historique de consommation et de facturation.
>
> ⚠️ **Vos identifiants de connexion à l'espace abonné ne permettent pas d'accéder à un moyen de paiement**, et aucun numéro de carte bancaire n'est conservé par HydroRégie.
>
> **Ce que nous vous recommandons :**
>
> 1. **Surveillez vos relevés bancaires** dans les prochaines semaines et signalez immédiatement à votre banque tout prélèvement que vous ne reconnaissez pas. *La réglementation vous protège en cas de prélèvement non autorisé : rapprochez-vous de votre banque.* 2. ⚠️ **Méfiez-vous des tentatives d'escroquerie.** Des personnes malveillantes peuvent vous contacter en se faisant passer pour HydroRégie, votre banque ou un service public. **Nous ne vous demanderons jamais** vos identifiants bancaires, un code reçu par SMS, ou un paiement en urgence. 3. Si vous utilisez le même mot de passe sur d'autres sites, **changez-le**.
>
> Cette situation a été **notifiée à l'autorité nationale de cybersécurité** ainsi qu'à la **Commission nationale de l'informatique et des libertés**. Une plainte a été déposée.
>
> **Pour toute question** : `<numéro dédié>` (du lundi au vendredi, 8 h - 18 h)
>
> *La direction d'HydroRégie*

---

3. Message n° 3 — Publié le 26/03/2027 (J+10)

> ### 💧 Retour à la normale de nos services
>
> **Jeudi 26 mars 2027 — 12 h 00**
>
> L'ensemble de nos services en ligne, notre accueil téléphonique et notre messagerie sont **rétablis**. Votre espace abonné est de nouveau accessible.
>
> **Ce qu'il faut retenir :** - **À aucun moment la distribution d'eau potable n'a été interrompue**, ni sa qualité affectée. - Nos systèmes ont été **entièrement reconstruits** sur une base saine. - Par précaution, **votre mot de passe d'accès à l'espace abonné a été réinitialisé** : vous devrez en choisir un nouveau à votre prochaine connexion. - Les factures suspendues seront émises à partir du 1er avril, **sans pénalité ni majoration**.
>
> ⚠️ **La vigilance reste de mise** concernant les tentatives d'escroquerie utilisant les données dérobées. Nous ne vous demanderons jamais vos coordonnées bancaires par téléphone ou par message.
>
> Nous vous remercions de votre compréhension et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
>
> *La direction d'HydroRégie*

---

4. Les règles de la communication de crise

✅ À faire	❌ À éviter
Commencer par ce qui rassure et qui est vrai : l'eau coule, elle est potable	Noyer l'information vitale dans le récit technique
Dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas encore, et **quand on redira quelque chose**	Le silence, qui laisse la place aux rumeurs
Donner une **action concrète** à l'usager	Un message purement descriptif
Avertir du risque d'escroquerie — il suit systématiquement une fuite de données	L'omettre : c'est le préjudice le plus fréquent pour les usagers
Tenir un **rythme de publication annoncé**	Publier au coup par coup
Faire valider par la direction et le juridique	Laisser un service communiquer seul
Employer un vocabulaire simple	« Exfiltration », « latéralisation », « charge utile »
Assumer sans se flageller	Nier, minimiser, ou promettre ce qu'on ne peut tenir

> 🔑 **Le réflexe qui compte pour un service d'eau** : la première question de l'usager n'est pas « mes données ? », c'est **« est-ce que je peux boire l'eau du robinet ? »**. La réponse doit être dans les trois premières lignes.

---

5. Ce qui doit être prêt **avant** la crise

Élément	Pourquoi
Messages types pré-rédigés (3 scénarios : service dégradé, fuite de données, coupure d'eau)	En crise, on n'écrit pas bien
Moyen de publication **indépendant du système d'information** (site externalisé, réseaux sociaux)	Le site institutionnel peut être hébergé sur l'infrastructure touchée
Numéro dédié et script de réponse pour l'accueil téléphonique	Éviter les improvisations contradictoires
Liste des élus, de l'autorité organisatrice et des médias locaux à prévenir en priorité	Ils apprendront la nouvelle ; autant qu'ils l'apprennent de vous
Porte-parole **unique** désigné	Une seule voix

ANNEXE E

Annexe E — Notification d'une violation de données personnelles (CNIL)

> 📗 **Fondement** : article 33 du RGPD (règlement (UE) 2016/679) — notification à l'autorité de contrôle dans les **72 heures** après en avoir pris connaissance. 📗 **Articulation avec NIS2** : article 35 de la directive (UE) 2022/2555 — les autorités s'informent mutuellement ; si une amende RGPD est prononcée, l'autorité NIS2 n'inflige pas d'amende pour le **même comportement**, mais conserve ses autres mesures d'exécution.

⚠️ Le point à ne surtout pas confondre

	(art. 23)	(art. 33-34)
Objet	Incident affectant les services et les systèmes	**Violation de données à caractère personnel**
Autorité	ANSSI / CSIRT national	**CNIL**
Délais	**24 h**, puis **72 h**, puis **1 mois**	**72 h**, une seule échéance
Point de départ	Connaissance de **l'incident**	Connaissance de **la violation**
Information des personnes	Destinataires des services, si affectés (art. 23(1))	Personnes concernées, si **risque élevé** (art. 34 RGPD)

> 🔴 **Les deux notifications sont dues.** L'article 35 de NIS2 ne porte que sur le **cumul des amendes**, jamais sur le cumul des **obligations**. Dans le scénario, T0 NIS2 est le 16/03 à 04 h 12 ; la connaissance de la **violation de données** (exfiltration confirmée) date du 18/03 au matin. Les deux horloges sont **distinctes**.

NOTIFICATION DE VIOLATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Fondement : article 33 du règlement (UE) 2016/679 **Autorité destinataire** : Commission nationale de l'informatique et des libertés **Responsable de traitement** : HydroRégie **Référence interne** : `VIOL-2027-0318-001` **Date d'envoi** : **jeudi 18 mars 2027, 17 h 30 Type de notification** : ☑ initiale ☐ complémentaire ☐ définitive

---

1. Responsable du traitement

Champ	Valeur
Organisme	HydroRégie
Adresse	`<adresse>`
Numéro SIREN	`<n°>`
Délégué à la protection des données	`<nom>` — `<courriel>` — `<téléphone>`

2. Nature de la violation

Champ	Valeur
Type	☑ Confidentialité (exfiltration) ☑ Disponibilité (chiffrement) ☐ Intégrité
Origine	☑ Acte malveillant externe ☐ Erreur interne ☐ Défaillance technique
Date de la violation	Exfiltration entre le **12** et le **14 mars 2027**
Date de prise de connaissance de la violation	**18 mars 2027 au matin**
Violation toujours en cours ?	Non — accès de l'attaquant révoqué le 17/03

Description :

> Dans le cadre d'une attaque par rançongiciel détectée le 16 mars 2027, les auteurs ont exfiltré environ **42 Go de données** depuis les serveurs de fichiers d'HydroRégie avant de procéder au chiffrement. Les données exfiltrées comprennent des exports de la base de gestion des abonnés. L'exfiltration a été confirmée le 18 mars par l'analyse des journaux de flux sortants.

3. Catégories et volume de données concernées

Catégorie de données	Concernée	Volume estimé
Identité (nom, prénom)	✅	240 000 personnes
Coordonnées (adresse postale, téléphone, courriel)	✅	240 000
Coordonnées bancaires (IBAN de prélèvement)	✅	≈ 186 000
Historique de consommation et de facturation	✅	240 000
Données de connexion à l'espace abonné (identifiants, empreintes de mots de passe)	✅	≈ 92 000
Numéros de carte bancaire	❌	Non conservés par HydroRégie
Données sensibles au sens de l'art. 9 RGPD	❌	Aucune
Données de mineurs	⚠️ Indirectement	Membres du foyer, non identifiés distinctement

Catégories de personnes concernées : abonnés au service d'eau potable (particuliers, copropriétés, entreprises, collectivités).

4. Conséquences probables

Risque	Niveau	Justification
Usurpation d'identité	🟠 Élevé	Identité + adresse + coordonnées complètes
Escroquerie ciblée / hameçonnage	🔴 **Très élevé**	Les données permettent des messages crédibles se faisant passer pour HydroRégie
Prélèvement frauduleux	🟠 Élevé	IBAN exposés — protection légale existante mais démarche à la charge de la personne
Réutilisation de mots de passe	🟠 Élevé	Empreintes exposées ; réutilisation fréquente sur d'autres services
Atteinte à la vie privée	🟡 Modéré	La consommation d'eau révèle des habitudes d'occupation du logement
Publication des données	🟠 Élevé	Mode opératoire de double extorsion : menace de divulgation

> ➡️ **Le risque est qualifié d'élevé** au sens de l'article 34 du RGPD. **Conséquence : information individuelle des personnes concernées obligatoire.**

5. Mesures prises et envisagées

#	Mesure	Date
1	Isolement des systèmes et révocation des accès de l'attaquant	16-17/03
2	Réinitialisation de tous les mots de passe internes	17/03
3	Réinitialisation forcée des mots de passe de l'espace abonné	26/03
4	Blocage des adresses de commande et contrôle	16/03
5	Reconstruction sur socle sain	17-26/03
6	**Information publique des usagers** (art. 23(1) NIS2)	16/03 et 19/03
7	**Information individuelle des personnes concernées** (art. 34 RGPD)	🗓️ prévue au 27/03
8	Dépôt de plainte	17/03
9	Notification à l'autorité NIS2 (24 h et 72 h)	16/03 et 18/03
10	Surveillance des espaces de divulgation	En continu
11	MFA généralisé aux comptes à privilèges et prestataires	30/03
12	Segmentation IT/OT accélérée	31/12/2027

6. Information des personnes concernées (art. 34 RGPD)

Champ	Valeur
Information réalisée ?	☐ Oui ☑ **Prévue** — le 27/03/2027
Modalités	Courriel individuel (abonnés disposant d'une adresse), courrier postal pour les autres, communiqué public en complément
Contenu	Nature de la violation, catégories de données, conséquences probables, **mesures recommandées** (surveillance des relevés bancaires, vigilance face aux escroqueries, changement des mots de passe réutilisés), coordonnées du DPO

📗 L'article 34 du RGPD impose une communication **en des termes clairs et simples**. Le message figure en annexe D, message n° 2.

7. Suites

> Une **notification complémentaire** sera transmise dès que le périmètre exact des données exfiltrées aura été établi (analyse des journaux en cours), et en cas de divulgation publique des données.

Rédigé par : `<nom>`, DPO · **Validé par** : `<nom>`, Directeur général **Transmis le** : 18/03/2027 à 17 h 30 · **Accusé de réception** : `<n°>`

📋 Aide-mémoire

✅ À faire	❌ À éviter
Distinguer **deux horloges** : T0 NIS2 et connaissance de la violation RGPD	Croire que les 72 h RGPD partent du même instant
Notifier même si le périmètre exact n'est pas connu (notification complémentaire prévue par l'art. 33(4))	Attendre l'analyse complète
Évaluer le risque **du point de vue des personnes**, pas de l'organisme	Minimiser pour éviter l'information individuelle
Coordonner RSSI et DPO sur **une seule main courante**	Deux récits divergents envoyés à deux autorités
Documenter la violation dans le **registre interne** (art. 33(5) RGPD) même si elle n'est pas notifiée	Ne rien tracer

---

Sources et fondements

Textes de référence

Référence	Objet
Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022	NIS2 — texte principal
Directive (UE) 2022/2557	REC — résilience des entités critiques
Recommandation 2003/361/CE	Définition des catégories d'entreprises (seuils de taille)
Directive (UE) 2020/2184	Eau destinée à la consommation humaine
Règlement (UE) 2016/679	RGPD
Règlement (UE) 2022/2554	DORA — secteur financier
Règlement d'exécution (UE) 2024/2690	Exigences techniques art. 21 pour certaines entités numériques

Articles de NIS2 mobilisés dans ce document

Article	Objet	Partie
art. 2(1) et 2(2)	Champ d'application, cas particuliers	1
art. 3(1)(a)	Entité essentielle	1
art. 3(4)	Enregistrement et mise à jour sous deux semaines	1
art. 4	Actes sectoriels (lex specialis)	1
art. 5	Harmonisation minimale	2
art. 6	Définitions	1
art. 11	Missions des CSIRT	4
art. 20	Gouvernance et responsabilité des dirigeants	2
art. 21(1) à 21(4)	Mesures de gestion des risques	2, 3
art. 23(1) à 23(5)	Notification des incidents	4
art. 25	Normalisation	3
art. 26	Compétence territoriale	1
art. 29 et 30	Partage d'informations, notification volontaire	4
art. 32	Supervision des entités essentielles	1, 2
art. 33	Supervision des entités importantes	1
art. 34(4) et 34(5)	Amendes administratives	1, 2
art. 35	Articulation avec le RGPD	4
art. 41 et 44	Transposition et abrogation de NIS1	Avertissement
annexe I, point 6	Secteur de l'eau potable	1

Sources officielles consultées

- Directive (UE) 2022/2555 — texte intégral : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj
- ANSSI — Directive NIS 2 : https://messervices.cyber.gouv.fr/nis2
- MonEspaceNIS2 — FAQ officielle : https://aide.monespacenis2.cyber.gouv.fr/
- Dossier législatif du projet de loi résilience (référence PRMD2412608L) : https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000050349138/
- ENISA — NIS Directive : https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive
- CERT-FR — alertes et avis : https://www.cert.ssi.gouv.fr/

Référentiels techniques mobilisés

Référentiel	Usage dans ce document
IEC 62443	Modèle zones et conduits — fondement du découpage de la partie 3
Modèle de Purdue (PERA)	Structuration en niveaux 0 à 5
ANSSI — *La cybersécurité des systèmes industriels*	Mesures OT
ANSSI — *Guide d'hygiène informatique*	Art. 21(2)(g)
EBIOS Risk Manager	Art. 21(2)(a) — analyse de risques
ISO 22301	Art. 21(2)(c) — continuité d'activité

Fin du document — Mise en conformité NIS2, HydroRégie, version 1.1 du 1er octobre 2026.
